

Stadiul implementării contractelor de lucrări din "Proiectul regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2021-2027" - august 2026

A. Contracte de proiectare și execuție

❖ **CL1B "Extinderea și modernizarea surse de apă, conducte de aducțiune apă brută, stații de tratare, stații de pompare și rezervoare în Județul Argeș"** – Contract nr. 69/01.04.2026.

Ordinul de începere al activităților de proiectare și execuție contract a fost emis cu data de 27.04.2026. Durata contractului este de 30 de luni de la ordinul de începere, din care 8 luni pentru elaborarea proiectelor tehnice și obținerea autorizației de construire și 22 de luni de execuție a lucrărilor. În perioada de referință, Antreprenorul a trimis spre analiza și aprobare Programul de Execuție detaliat al întregului Contract. Sunt în curs de elaborare Proiectul Tehnic și Detaliile de execuție.



❖ **Contractul de lucrări CL3 „Extindere și modernizare stații de epurare în județul Argeș”** – Contract nr. 186/23.06.2026.

Durata de execuție a contractului este de 30 de luni, din care 8 luni pentru proiectare și obținerea autorizației de construire și 22 luni pentru execuția lucrărilor. În perioada de referință au fost desfășurate activități contractuale specifice începerii contractului (constituire garanție de bună execuție și asigurări obligatorii conform prevederilor contractuale, analiza proiectului). Ordinul administrativ de începere al activității de proiectare a fost emis cu data de 10.08.2026.

❖ **Contractul de lucrări CL4A "Reabilitare aducțiuni apă tratată, rezervoare de înmagazinare și colector principal apă uzată (Tronson Celly-SEAU Pitești) în municipiul Pitești"** - Contract nr. 218/19.08.2025.

Ordinul de începere al activităților de proiectare și execuție contract a fost emis cu data de 15.09.2025. Durata contractului este de 31 de luni de la ordinul de începere, din care 8 luni pentru elaborarea proiectelor tehnice și obținerea autorizației de construire și 23 de luni de execuție a lucrărilor. Până la 31.07.2026, în cadrul contractului au fost realizate următoarele activități:

- au fost elaborate documentațiile tehnice pentru obținerea certificatelor de urbanism, avizelor și acordurilor cerute prin acestea și a solicitat emiterea Autorizației de construire.

- au fost obținute Certificatul de urbanism nr. 921 din 31.10.2025 pentru Obiect 1 Rezervoare înmagazinare apă; Certificatul de urbanism nr. 922 din 31.10.2025 pentru Obiect 2 Colector principal apă uzată; Autorizația de Construire nr. 76/31.03.2026 pentru Obiect 1 - Rezervoare înmagazinare apă.
- au fost depuse spre aprobare documentațiile tehnice pentru următoarele obiective: DTOE Ob.1 - rezervoare de înmagazinare apă; PT + DE rezervor ZIN - versiune 1; PT+DE rezervoare Schitului 1, 2 - versiune 1; PT+DE - reparații structuri beton rezervoare și camere de vane - Obiect 1 - Reabilitare rezervoare înmagazinare apă; PT+DE reabilitare rezervoare Smeura 1, 2; PT+DE reabilitare rezervoare Războieni 1,2,3,4.

În 14.05.2026 a fost transmisă la Inspectoratul de Stat în Construcții comunicarea privind începerea lucrărilor de execuție cu data de 26.05.2026.



Cu adresa nr.3409 din 10.08.2026 Antreprenorul a prezentat un Program de Executie actualizat intocmit in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 din CGC.



B. Contracte de execuție lucrări

❖ **CL5.1 „Reabilitarea si extinderea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Pitești – Zona Nord”** - Contract nr. 148/26.05.2026

Durata de execuție a contractului este de 36 de luni. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis cu data de 20.07.2026. În perioada de referință au fost desfășurate activități contractuale specifice începerii contractului (ședința de început, analiză proiect, alte aspecte administrative).

❖ **CL5.2A Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești – zona Centru** - Contract nr. 261/ 07.10.2025

Pitești Centru	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Reabilitare rețele distribuție	12,49	4,73
Reabilitare rețele canalizare	5,72	0,872

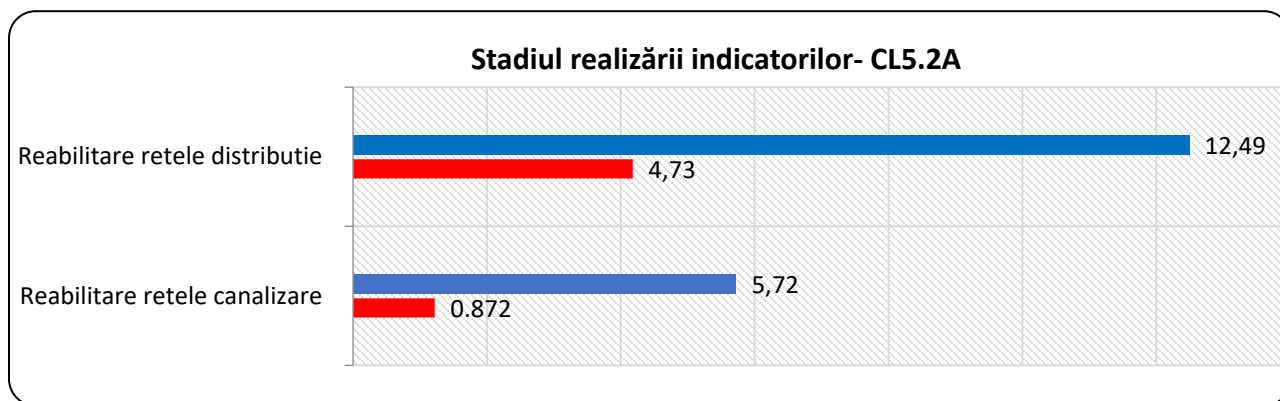


❖ **CL5.3 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești – zona Sud**

Contractul este finalizat. Recepția la terminarea lucrărilor s-a încheiat prin semnarea **Procesului Verbal la Terminarea Lucrărilor nr. 1 din data de 07.08.2024.**

Prin acest contract de lucrări au fost realizate următoarele lucrări:


- extinderea rețelei de alimentare cu apă cu o lungime de aprox. 1 km;
- extinderea rețelei de canalizare cu 1,1 km și realizarea unei stații de pompare ape uzate;
- reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în lungime de aprox. 1 km;
- reabilitarea rețelei de canalizare în lungime de 4,4 km.



❖ **CL6 Aducțiune Pitești – Moșoaia - Poiana Lacului; Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comunele Bascov și Moșoaia** - Contract nr. 44/26.02.2024


MOSOAIA	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Extindere rețele distribuție	5,17	1,76
Extindere aducțiune	2,27	2,05
Rezervoare Înmagazinare noi	2,00	0,00
Clorinare	1,00	0,00
Stație pompare apă potabilă (SPAP)	1	0
Extindere rețea canalizare	4,34	1,46
Conducte de refulare	1,65	0,82
Stații de pompare apă uzată (SPAU)	6	0

Stadiul realizării indicatorilor apă/canal - Moșoaia

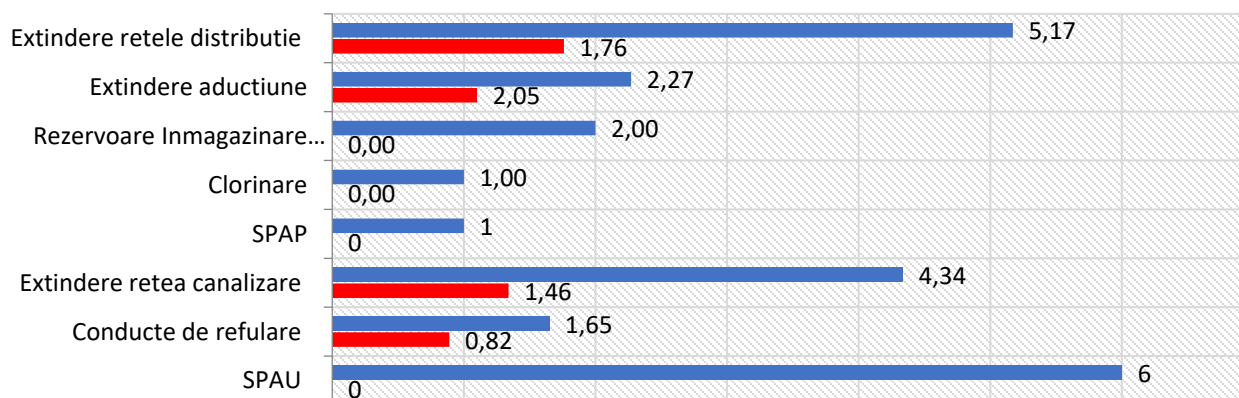


BASCOV	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Extindere rețele distribuție	4,94	1,57
Reabilitare rețele distribuție	3,16	0,00
Stație pompare apă potabilă (SPAP)	1	0
Extindere rețea canalizare	12,34	4,50
Conducte de refulare	2,50	1,40
Stații de pompare apă uzată (SPAU)	18	0

Stadiul realizării indicatorilor rețele apă/canal - Bascov

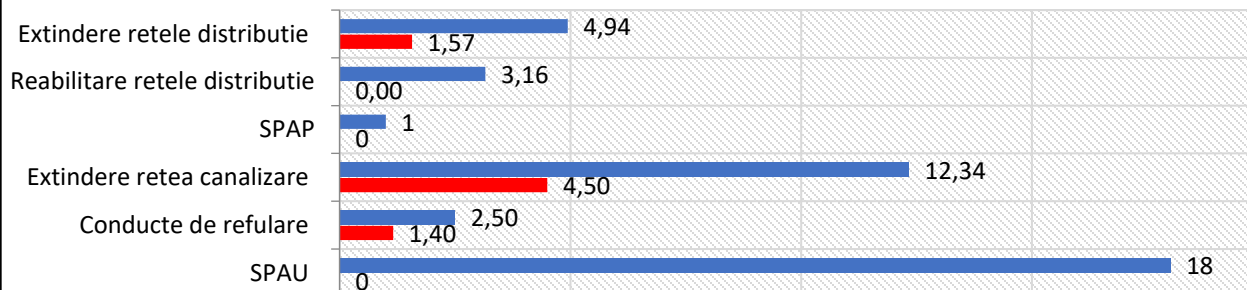


POIANA LACULUI	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Extindere aducțiune	11,82	8,5
Rezervoare înmagazinare noi	2	0
Clorinare	1	0
Stație pompare apă potabilă (SPAP)	1	0

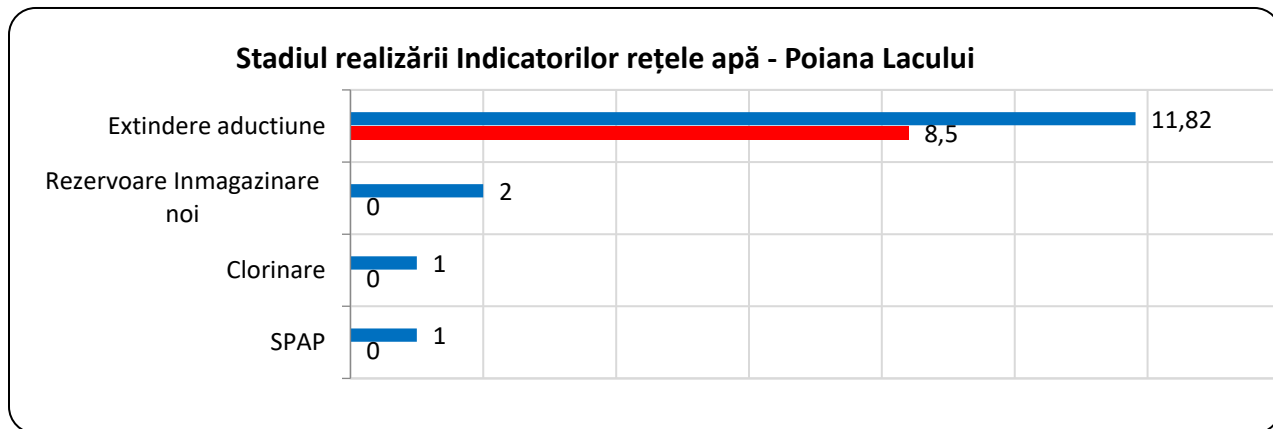


❖ **CL7 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ștefănești**
- Contract nr. 41/22.02.2024

ȘTEFĂNEȘTI	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Extindere rețele distribuție	21,64	3,69
Reabilitare rețele distribuție	3,85	1,21
Stație pompare apă potabilă (SPAP)	3,00	0,00
Extindere rețea canalizare	26,08	4,33
Reabilitare rețea de canalizare	3,93	1,50
Conducte de refulare	11,26	2,04
Reabilitare conducte de refulare	0,99	0,20
Reabilitare SPAU	4,00	0,00
Stații de pompare apă uzată (SPAU)	35,00	0,00

Stadiul realizării indicatorilor apă/canal CL7 - Ștefănești

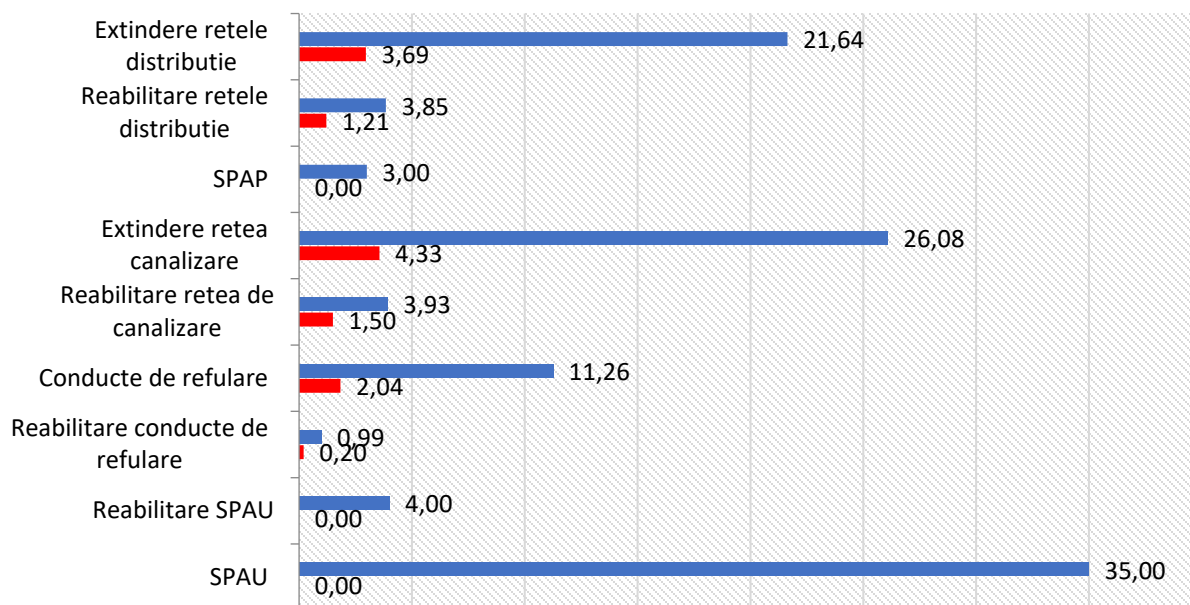


Progres contract CL7



❖ **CL8 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Topoloveni, Bradu, Căteasca și Albota** - Contract nr. 65/11.03.2024


TOPOLOVENI	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Extindere rețele distribuție	8,26	7,52
Reabilitare rețele distribuție	1,20	1,20
Clorinare	1	0,00
Extindere rețea canalizare	7,31	7,03
Conducte de refulare	2,04	1,54
Stații de pompare apă uzată (SPAU)	6	4

Stadiul realizării indicatorilor apă/canal - Topoloveni

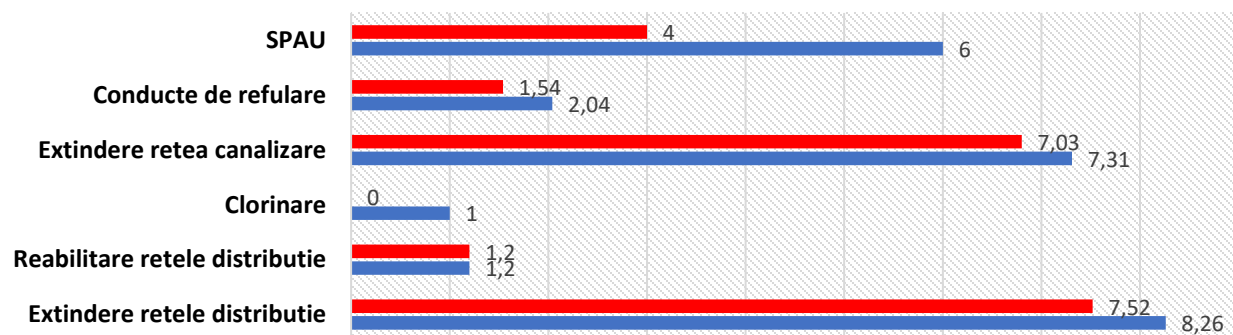


BRADU	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Reabilitare aducțiune	1,94	1,71
Reabilitare rețea canalizare	9,07	2,17
Conducte de refulare	0,50	0,50
Stații de pompare apă uzată (SPAU)	1	0

Stadiul realizării indicatorilor apă canal Bradu



ALBOTA	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Extindere rețea canalizare	25,28	21,35
Conducte de refulare	3,72	3,34
Stații de pompare apă uzată (SPAU)	10	6

Stadiul realizării indicatorilor rețele canalizare - Albota

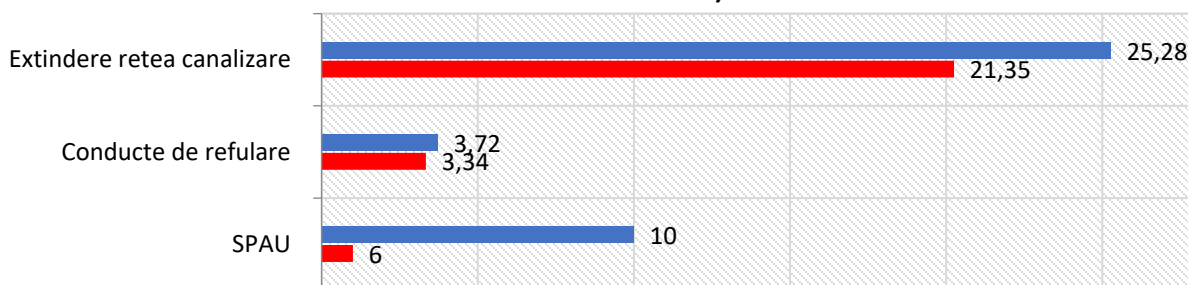


Progres contract CL8



❖ **CL9 Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Costești și comuna Buzoești** - Contract nr. 222/14.09.2023


COSTESTI	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Extindere aducțiune	5,09	3,79
Extindere rețele distribuție	2,32	3,73
Reabilitare rețele distribuție	1,78	1,81
Reabilitare SPAP	1	0
Stație pompare apă potabilă (SPAP)	2	0
Extindere rețea canalizare	40,31	40,00
Conducte de refulare	4,24	3,66
Stații de pompare apă uzată (SPAU)	19	2

Stadiul realizării indicatorilor apă/canal- Costesti

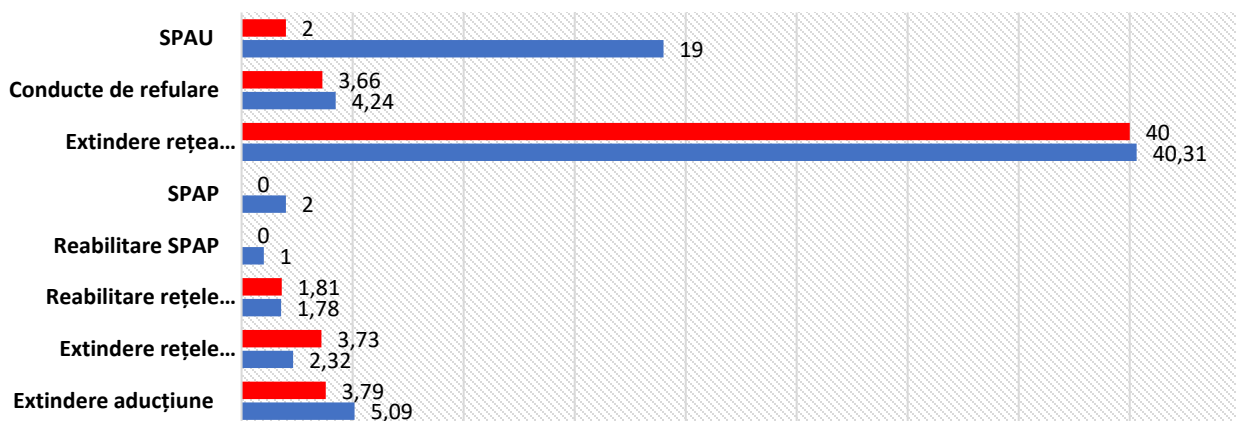

BUZOESTI	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Extindere aducțiune	15,03	14,55
Extindere rețea canalizare	25,91	13,04
Conducte de refulare	9,85	8,01
Stații de pompare apă uzată (SPAU)	15	0

Stadiul realizării indicatorilor apă/canal- Buzoești

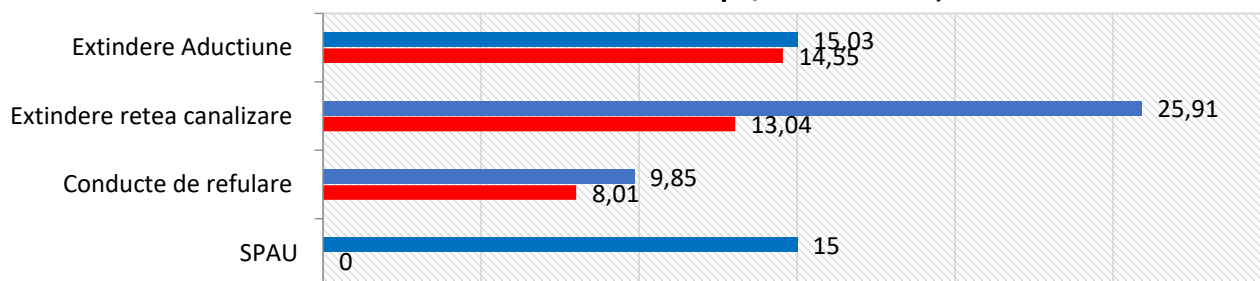


Progres contract CL9



❖ **CL10 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Poiana Lacului** - Contractul nr. 68/25.03.2025

POIANA LACULUI	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Reabilitare rețele de distribuție	12,99	6,20
Reabilitare rezervoare Înmagazinare	1,00	0,00
Extindere rețea canalizare	54,86	22,23
Conducte de refulare noi	21,18	3,09
Stații de pompare apă uzată (SPAU)	25	0

Stadiul realizării indicatorilor apă/canal- Poiana Lacului

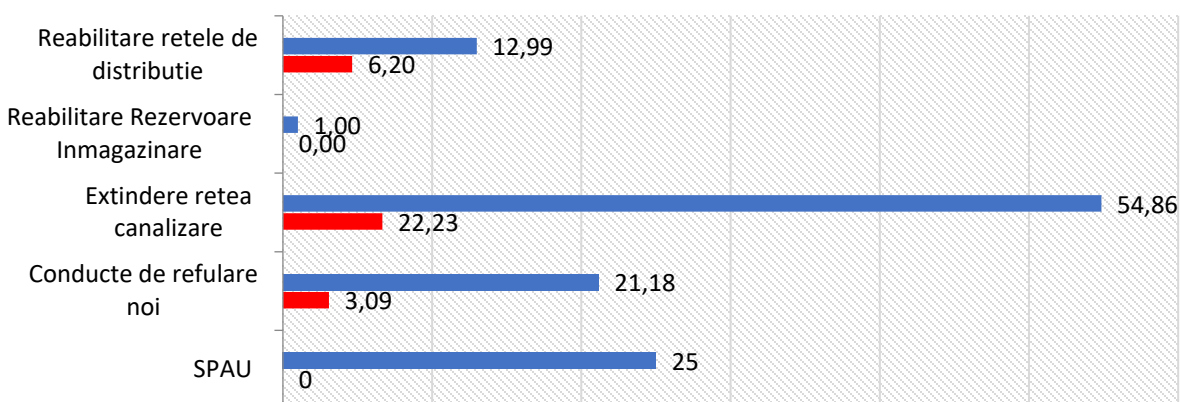


Progres contract CL10



❖ CL11 Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Stolnici

STOLNICI	Planificat	Realizat la 31.08.2026
Extindere aducțiune apă tratată	4,74	2,27
Extindere rețele distribuție	3,31	2,70
Reabilitare aducțiune apă tratată	1,16	1,14
Reabilitare SPAP (stație pompare apa potabilă)	1	0
Extindere rețea de canalizare	40,18	38,96
Conducte de refulare	4,77	4,56
Stații de pompare apă uzată (SPAU)	11	0

Stadiul realizării Indicatorilor apă/canal - Stolnici

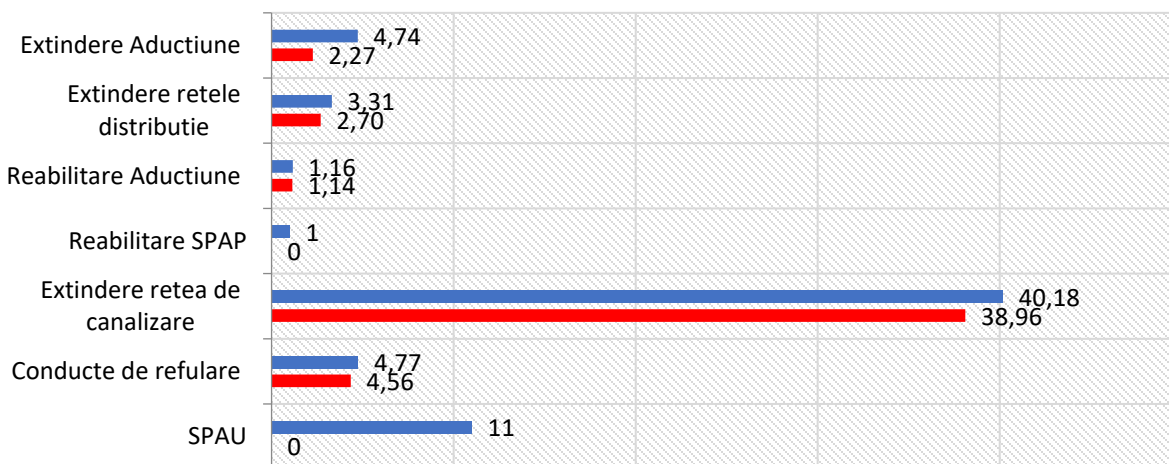

Progres contract CL11

