

Stadiul implementării lucrărilor de extindere/reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2021-2027" la 31.01.2026 este următorul:

1. CL4A - Reabilitare aducțiuni apă tratată, rezervoare de înmagazinare și colector principal apă uzată (Tronson Celly - SEAU Pitești) în municipiul Pitești

CL4A este un contract de lucrări de tip proiectare și execuție. Ordinul de începere al lucrărilor a fost dat cu data de 15.09.2025. Contractul este în etapa de proiectare, de elaborare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, Antreprenorul având un termen de 6 luni de la Ordinul de începere pentru aprobarea PT.

Rezumatul lucrărilor executate

- **Activități de Proiectare:** În perioada de raportare a început elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție și s-a depus spre aprobare Proiectul Tehnologic preliminar pentru Obiect 1 - Rezervoare de înmagazinare apă.
- **Activități pentru obținere avize / autorizații:** Antreprenorul a elaborat documentațiile tehnice pentru obținerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor și a Autorizației de construire. Au fost obținute două certificate de urbanism: Certificatul de urbanism nr. 921 din 31.10.2025 pentru Obiect 1 Rezervoare înmagazinare apă și Certificatul de urbanism nr. 922 din 31.10.2025 pentru Obiect 2 Colector principal apă uzată și avizele solicitate prin acestea.





2. CL5.2A Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Pitești - zona centru

CL5.2A este un contract de tip execuție. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis cu data de 20.10.2025, durata de execuție a contractului fiind de 30 de luni de la ordinul de începere. În data de 12.11.2025 a fost predat amplasamentul general al lucrărilor.

Rezumatul lucrărilor executate

Lucrările de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă și canalizare este în derulare, fronturi de lucru fiind deschise pe străzile Frații Golești, Stadionului, Nicolae Dobrin, Traian Vuia și M. Eminescu din Municipiul Pitești.

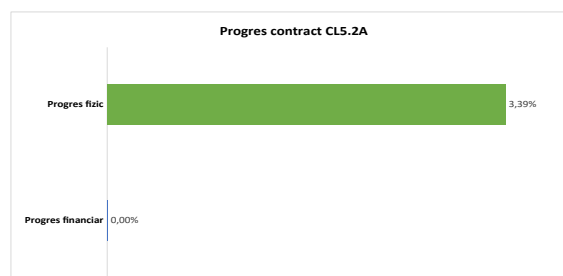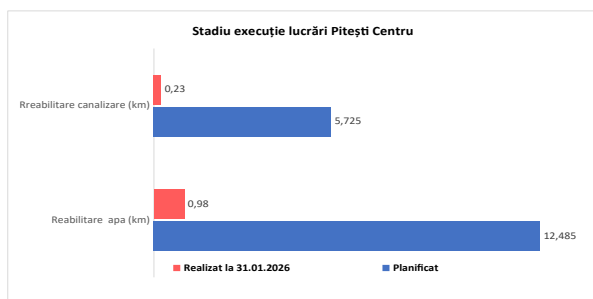


Până la 31.01.2026 Contractul de lucrări nu a înregistrat un progres financiar, Antreprenorul nu a transmis situații de lucrări.

3. CL5.3 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești - Zona Sud

Contractul este finalizat. Recepția la terminarea lucrărilor s-a încheiat prin semnarea Procesului Verbal la Terminarea Lucrărilor nr. 1 din data de 07.08.2024. Prin acest contract de lucrări au fost realizate următoarele lucrări:

- extinderea rețelei de alimentare cu apă cu o lungime de aprox. 1 km;
 - extinderea rețelei de canalizare cu 1,1 km și realizarea unei stații de pompare ape uzate;
 - reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în lungime de aprox. 1 km;
- reabilitarea rețelei de canalizare în lungime de 4,4 km.






4. CL6 - Aducțiune Pitești - Moșoaia - Poiana Lacului; Extindere și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comunele Bascov și Moșoaia

CL6 este un contract de lucrări de tip execuție, Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis cu data de 25.02.2025. Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită până la 25.07.2026.


Rezumatul lucrărilor executate

În perioada de raportare au fost executate lucrări de extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră, defalcate după cum urmează:

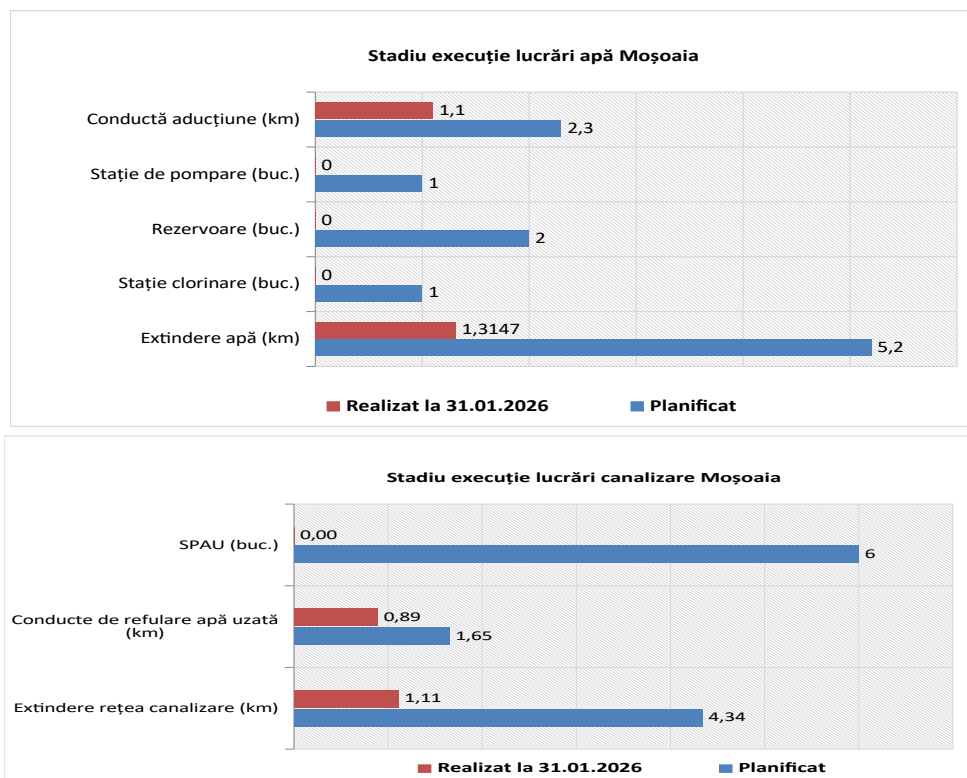

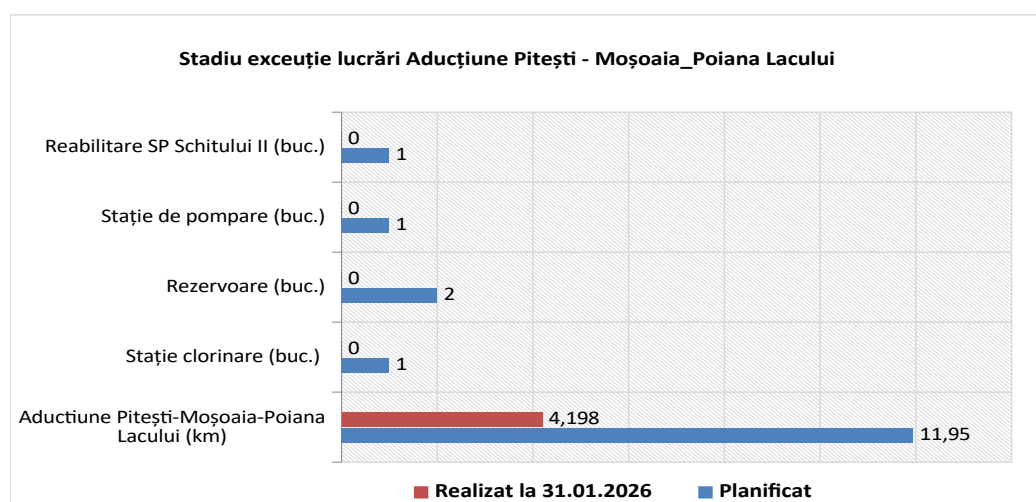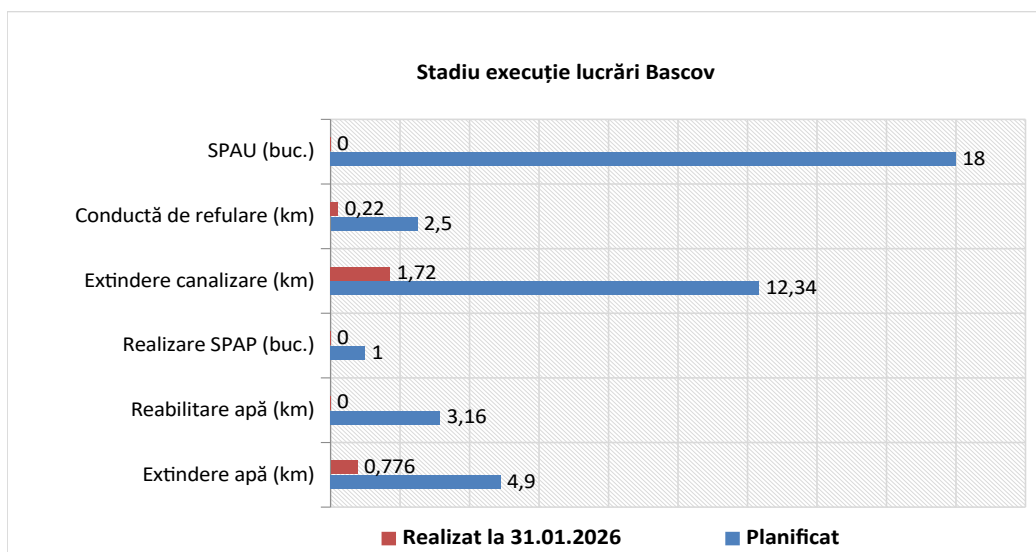

În cadrul contractului au fost realizate probe de presiune și/sau etanșeitate și verificare CCTV a lucrărilor executate și finalizate.

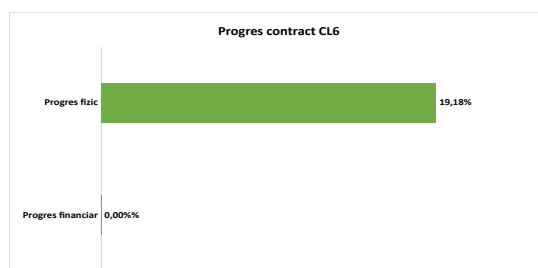



Până la 31.01.2026 Antreprenorul desemnat nu a transmis situații de lucrări pentru certificare și plată.

5. **CL7** Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ștefănești


CL7 este un contract de lucrări de tip execuție, Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis cu data de 21.02.2025. Durata contractului de lucrări este de 14 luni.

Rezumatul lucrărilor executate

În perioada de referință Antreprenorul a început execuția lucrărilor pe 35 de străzi din Orașul Ștefănești. Supervisorul monitorizează execuția Lucrărilor prin experții mobilizați în cadrul acestui contract, respectiv prin Dirigintele de Șantier. În perioada de raportare au fost executate lucrări la rețeaua de apă și canalizare menajeră, defalcate după cum urmează:

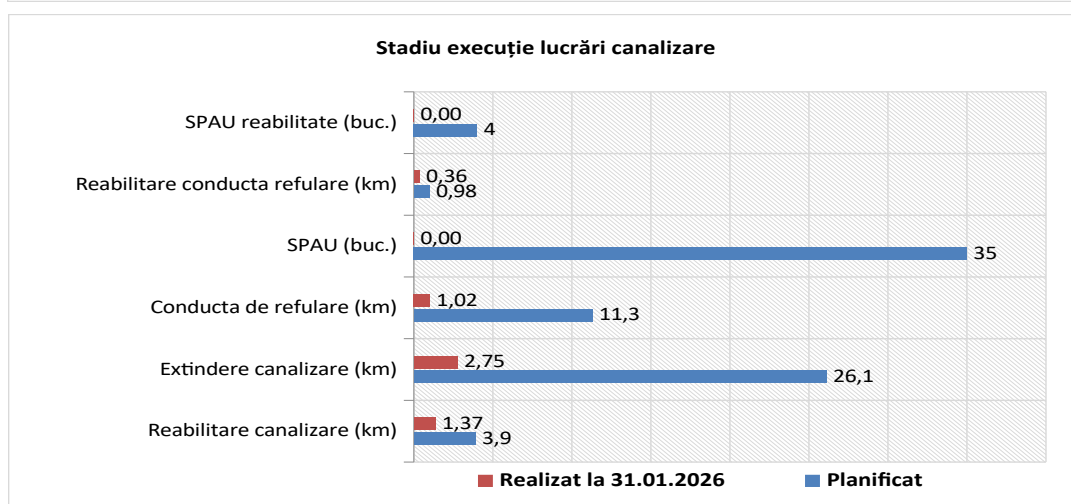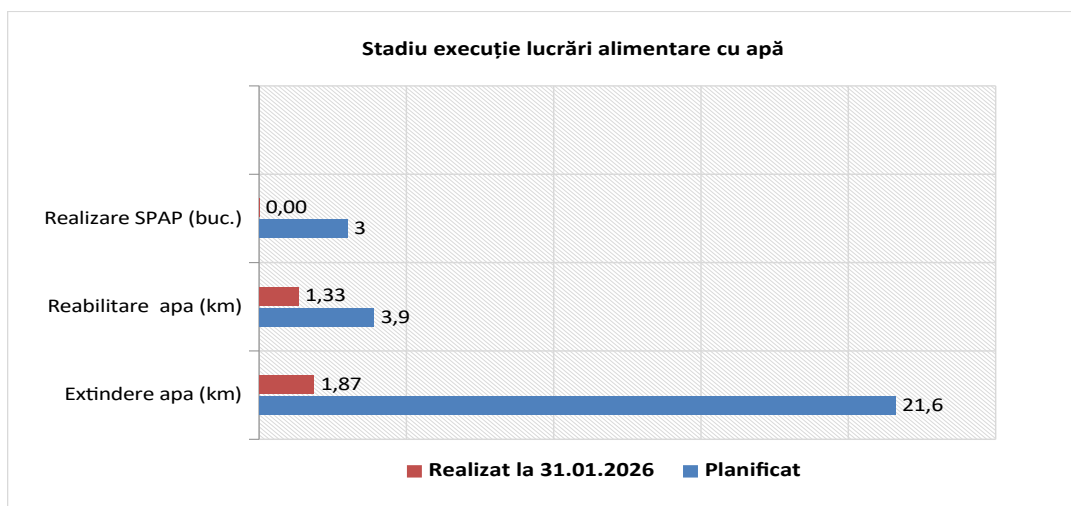

În cadrul contractului au fost realizate probe de presiune și/sau etanșeitate și verificare CCTV a lucrărilor executate și finalizate. Progresul fizic este considerat numai pe tronsoanele de lucrări care pot fi măsurate și cuantificate în condițiile din Preambulul listelor de cantități.






6. CL8 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Topoloveni, Bradu, Căteasca și Albota


CL8 este un contract de lucrări de tip execuție, Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis cu data de 23.04.2024. Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită până la 01.05.2026.

Rezumatul lucrărilor executate

În perioada de raportare au fost executate lucrări la rețeaua de apă și canalizare menajeră, defalcate după cum urmează:

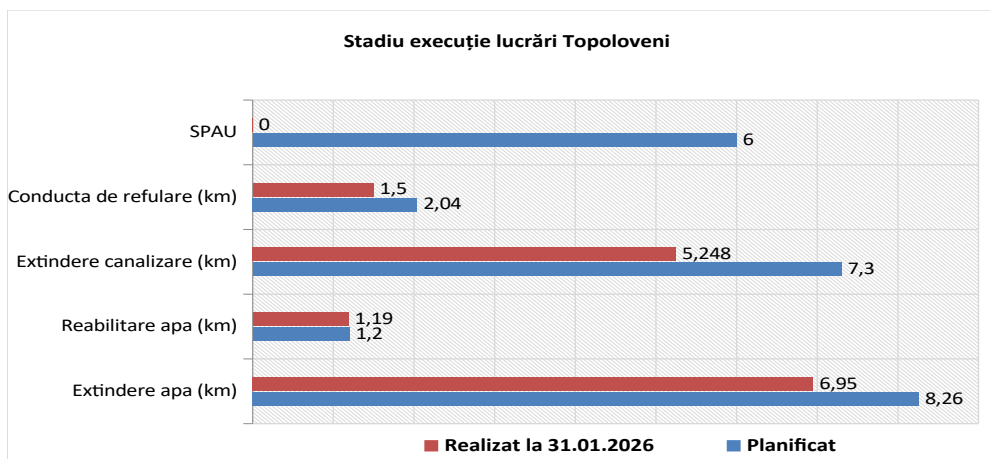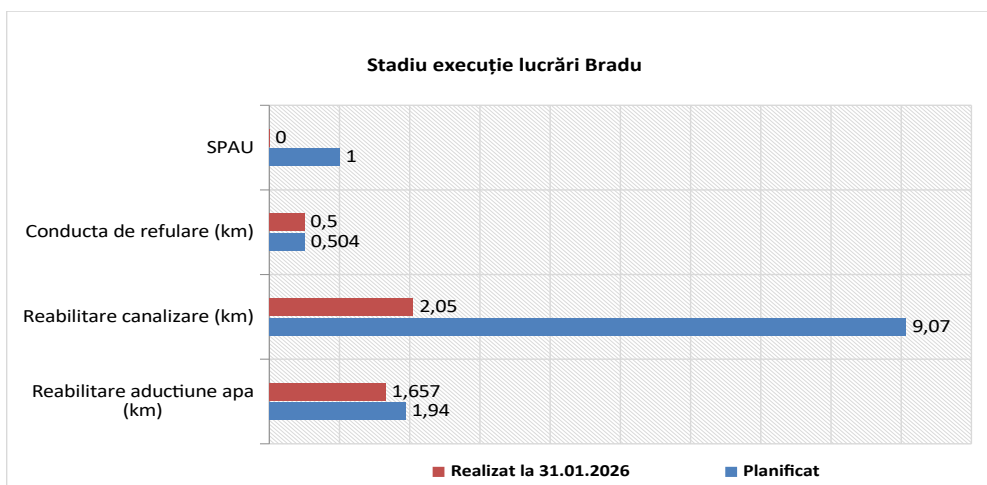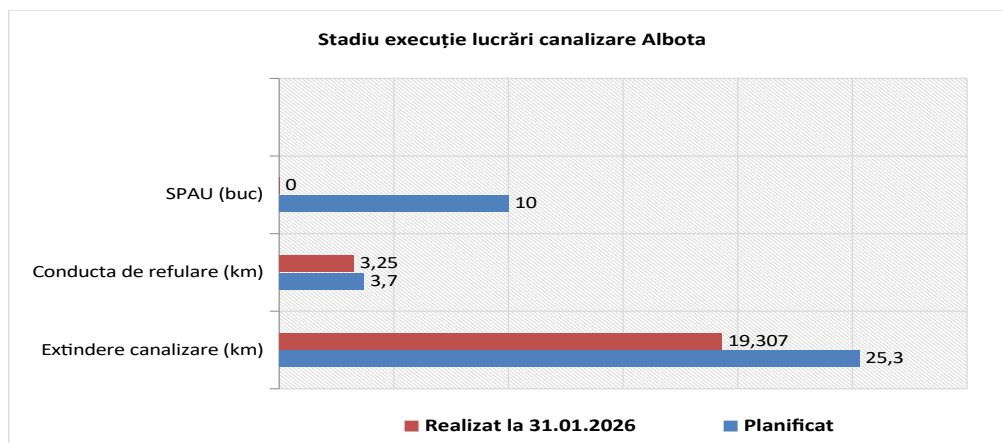

În cadrul contractului au fost realizate probe de presiune și/sau etanșeitate și verificare CCTV a lucrărilor executate și finalizate. În UAT Căteasca nu au fost executate lucrări.






7. CL9 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Costești și comuna Buzoești

CL9 este un contract de lucrări de tip execuție, Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis cu data de 04.12.2023. Durata de execuție a contractului a fost prelungită până la 31.03.2026.


Rezumatul lucrărilor executate

În perioada de referință Antreprenorul a executat lucrări de extindere și reabilitare a rețelei de alimentare cu apă și de extindere canalizare menajeră, după cum urmează:

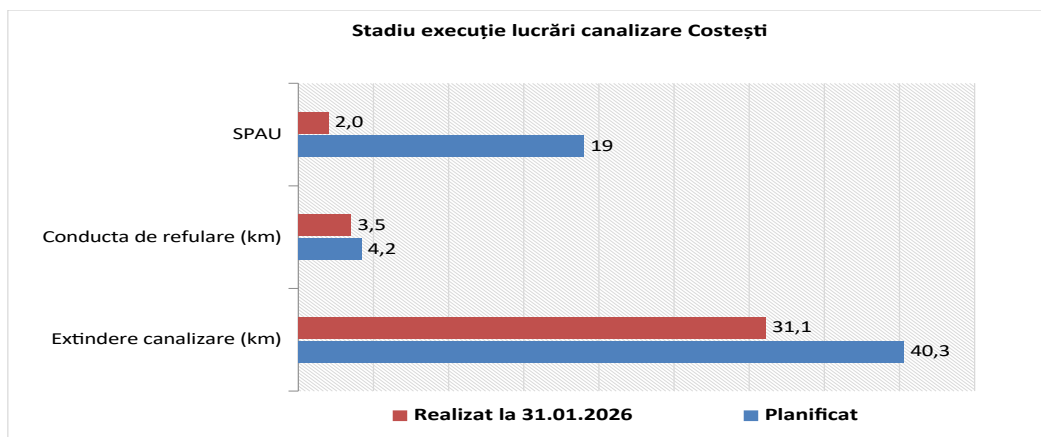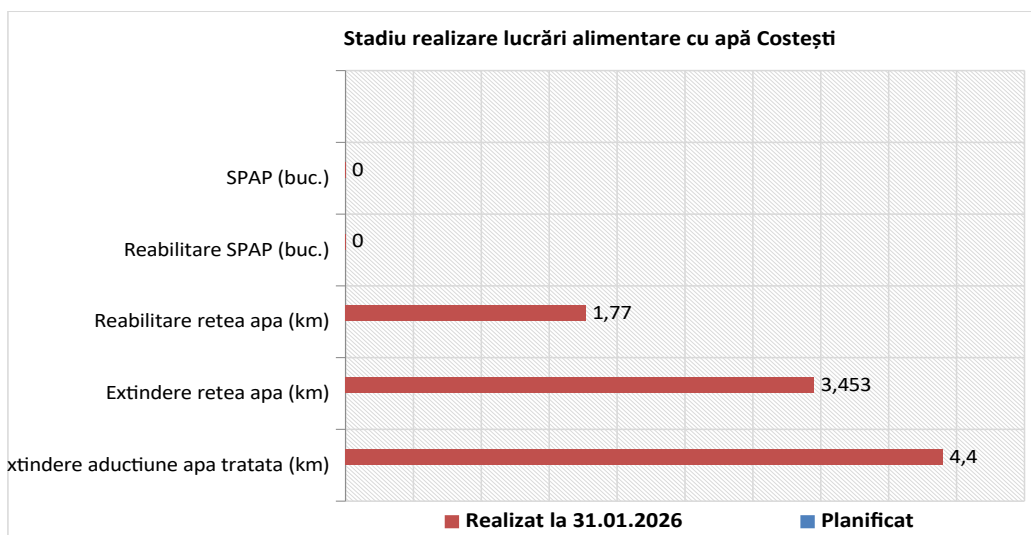

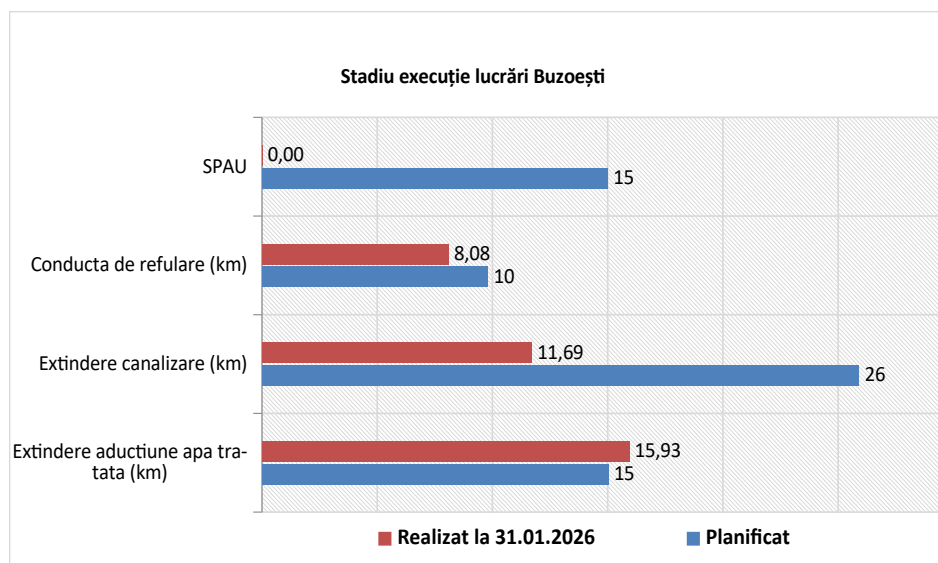

În cadrul contractului au fost realizate probe de presiune și/sau etanșeitate și verificare CCTV a lucrărilor executate și finalizate.





8. CL10 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Poiana Lacului

CL10 este un contract de lucrări de tip execuție. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis cu data de 23.06.2025. Durata contractului este de 28 de luni de la data ordinului de începere.

Rezumatul lucrărilor executate

În perioada de referință Antreprenorul a început execuția lucrărilor de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă și de extindere a rețelei de canalizare menajeră. Stadiul de realizare al lucrărilor executate identificate de Supervisor în șantier sunt:

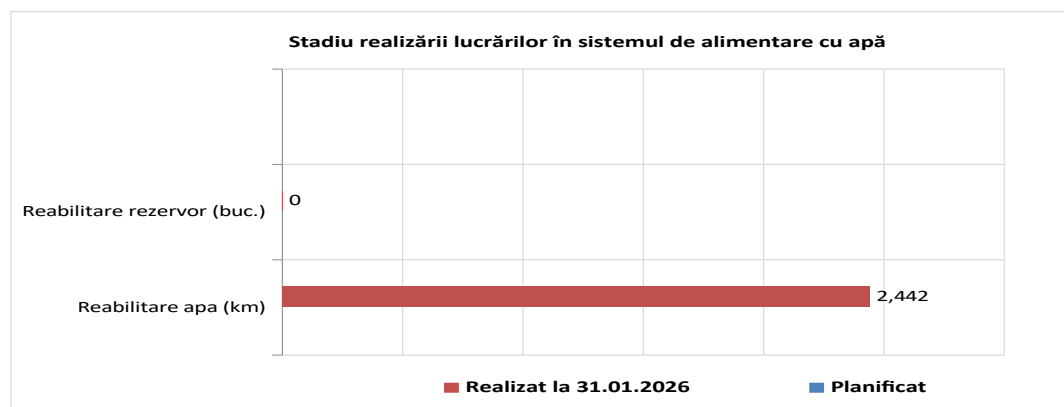

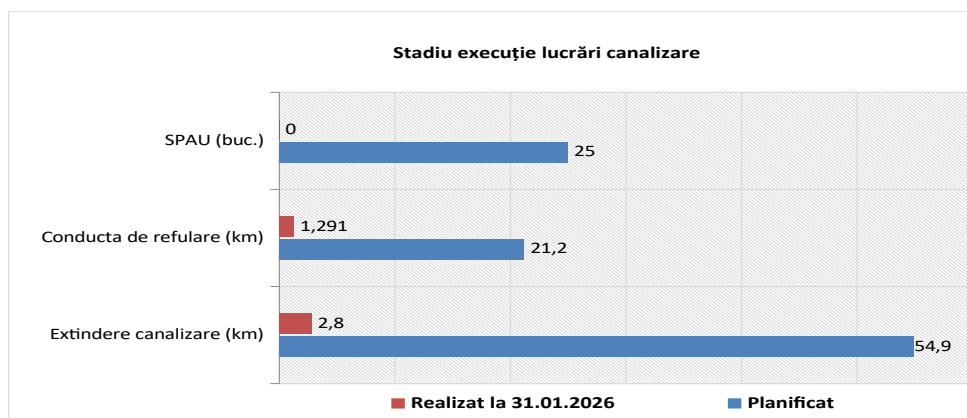

În cadrul contractului au fost realizate probe de presiune și/sau etanșeitate și verificare CCTV a lucrărilor executate și finalizate.





9. CL11 Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Stolnici

CL11 este un contract de lucrări de tip execuție. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis cu data de 27.11.2023. Durata contractului a fost prelungită până la 15.06.2026.

Rezumatul lucrărilor executate

Până la data de referință în cadrul contractului CL11 au fost executate lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă, conductă de aducțiune apă tratată și extindere a rețelei de canalizare menajeră, defalcate după cum urmează:

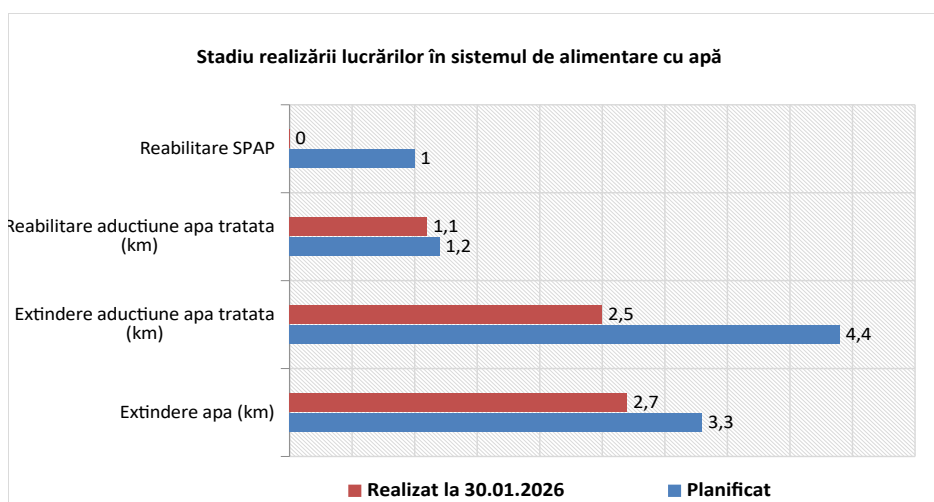

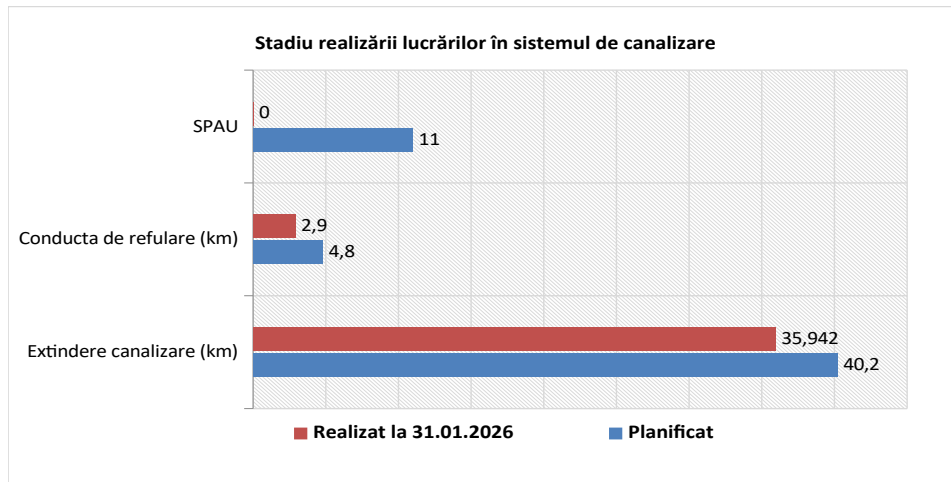

În cadrul contractului au fost realizate probe de presiune și/sau etanșeitate și verificare CCTV a lucrărilor executate și finalizate.

