

Stadiul implementării contractelor Iunie 2026

❖ **CL1B "Extinderea și modernizarea surse de apă, conducte de aducțiune apă brută, stații de tratare, stații de pompare și rezervoare în Județul Argeș"** – contract de tip proiectare și execuție.

Ordinul de începere al execuției activităților de proiectare și execuție contract a fost emis cu data de 27.04.2026. Durata contractului este de 30 de luni de la ordinul de începere, din care 8 luni pentru elaborarea proiectelor tehnice și obținerea autorizației de construire și 22 de luni de execuție a lucrărilor. Antreprenorul a trimis spre analiza și aprobare Programul de Execuție detaliat al întregului Contract.

❖ **Contractul de lucrări CL4A "Reabilitare aducțiuni apă tratată, rezervoare de înmagazinare și colector principal apă uzată (Tronson Celly-SEAU Pitești) în municipiul Pitești"**:

Contractul este de tip proiectare și execuție, ordinul de începere al execuției activităților de proiectare și execuție contract a fost emis cu data de 15.09.2025. Durata contractului este de 31 de luni de la ordinul de începere, din care 8 luni pentru elaborarea proiectelor tehnice și obținerea autorizației de construire și 23 de luni de execuție a lucrărilor.

Până la 30.06.2026, în cadrul contractului au fost realizate următoarele:

- au fost elaborate documentațiile tehnice pentru obținerea certificatelor de urbanism, avizelor și acordurilor cerute prin acestea și a solicitat emiterea Autorizației de construire.
- au fost obținute Certificatul de urbanism nr. 921 din 31.10.2025 pentru Obiect 1 Rezervoare înmagazinare apă; Certificatul de urbanism nr. 922 din 31.10.2025 pentru Obiect 2 Colector principal apă uzată; Autorizația de Construire nr. 76/31.03.2026 pentru Obiect 1 - Rezervoare înmagazinare apă.
- au fost depuse spre aprobare documentațiile tehnice pentru următoarele obiective: DTOE Ob.1 - rezervoare de înmagazinare apă; PT + DE rezervor ZIN - versiune 1; PT+DE rezervoare Schitului 1, 2 - versiune 1; PT+DE - reparații structuri beton rezervoare și camere de vane - Obiect 1 - Reabilitare rezervoare înmagazinare apă; PT+DE reabilitare rezervoare Smeura 1, 2; PT+DE reabilitare rezervoare Războieni 1,2,3,4. Documentațiile sunt în analiză la Supervisor

În 14.05.2026 a fost transmisă la Inspectoratul de Stat în Construcții comunicarea privind începerea lucrărilor de execuție începând cu data de 26.05.2026.



La data de 30.06.2026, respectiv la 289 zile de la Data de Începere, Antreprenorul nu a prezentat încă un Program de Execuție detaliat al întregului Contract cu respectarea Clauzei 17

[Programul de Execuție], subclauza 17.1 din CGC, care să aibă acordul Supervisorului și nici edițiile lunare ale Programului de Execuție actualizat întocmit în conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 din CGC.

- ✓ *Progresul fizic este de 50 % la etapa de elaborare PT+DE*
- ✓ *Progres financiar: 10 % (avans)*

❖ **CL5.2A Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești – zona Centru**

Pitești Centru	Planificat	Realizat la 30.06.2026
Reabilitare rețele distribuție	12,49	4,18
Reabilitare rețele canalizare	5,72	1,219

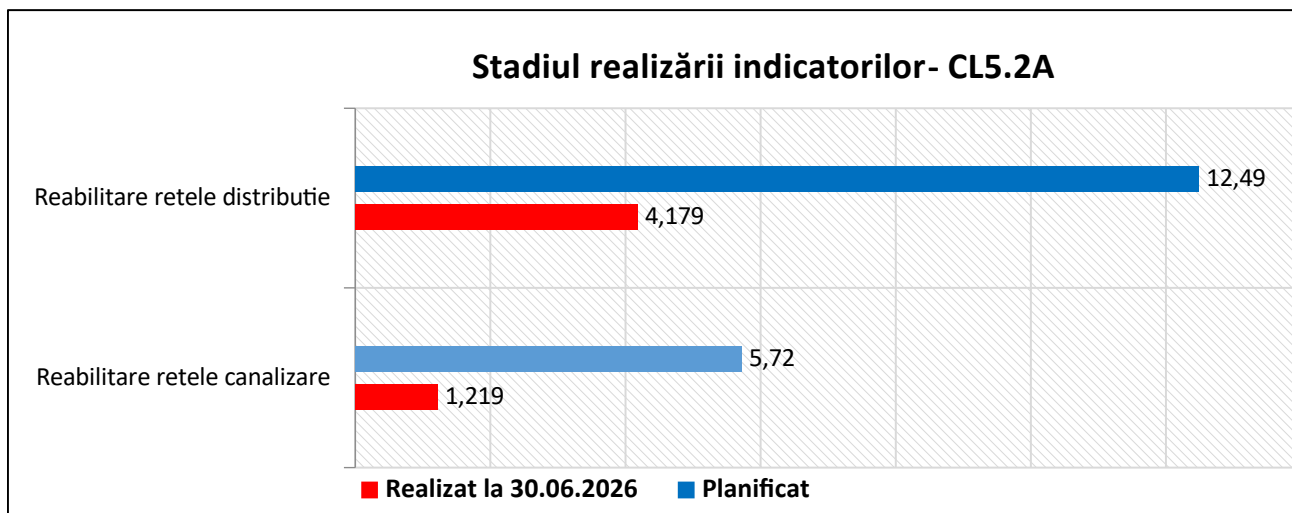


❖ **CL5.3 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești – zona Sud**

Contractul este finalizat. Recepția la terminarea lucrărilor s-a încheiat prin semnarea **Procesului Verbal la Terminarea Lucrărilor nr. 1 din data de 07.08.2024.**


Prin acest contract de lucrări au fost realizate următoarele lucrări:

- extinderea rețelei de alimentare cu apă cu o lungime de aprox. 1 km;
 - extinderea rețelei de canalizare cu 1,1 km și realizarea unei stații de pompare ape uzate;
 - reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în lungime de aprox. 1 km;
- reabilitarea rețelei de canalizare în lungime de 4,4 km.




❖ **CL6 Aducțiune Pitești – Moșoaia - Poiana Lacului; Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comunele Bascov și Moșoaia**

MOSOIA	Planificat	Realizat la 30.06.2026
Extindere retele distributie	5,17	1,76
Extindere aductiune	2,27	1,10
Rezervoare Inmagazinare noi	2,00	0,00
Clorinare	1,00	0,00
SPAP	1	0
Extindere retea canalizare	4,34	1,34
Conducte de refulare	1,65	0,89
SPAU	6	0

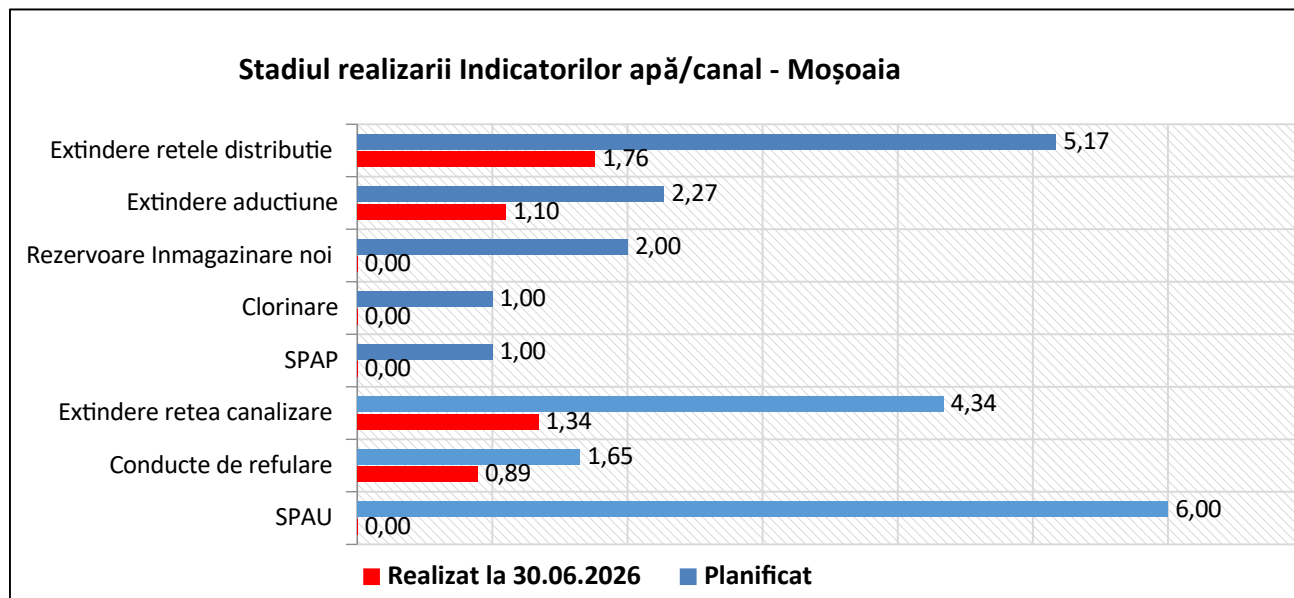


Stadiul realizării Indicatorilor rețele apă/canal - Bascov

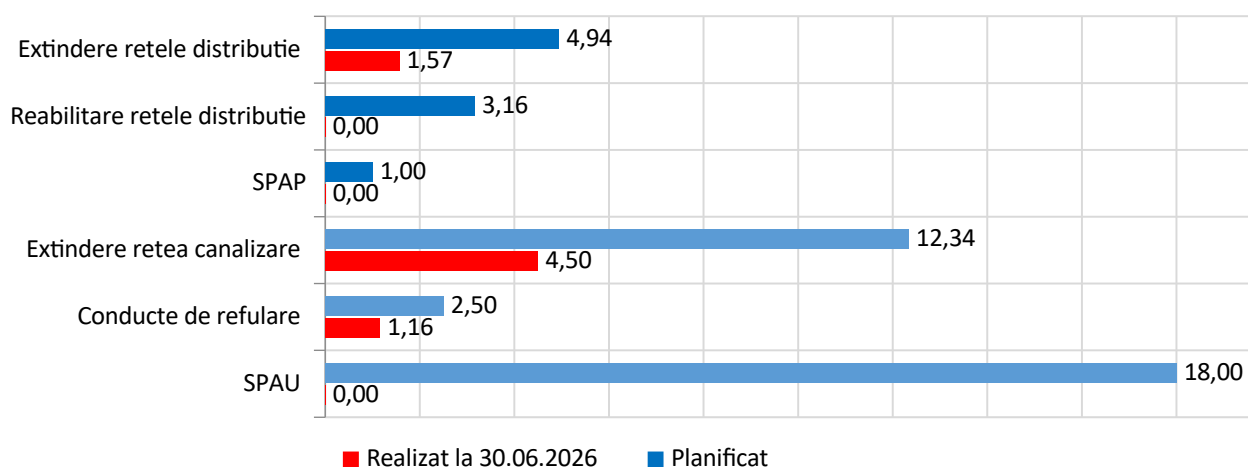

BASCOV	Planificat	Realizat la 30.06.2026
Extindere rețele distributie	4,94	1,57
Reabilitare rețele distributie	3,16	0,00
SPAP	1	0
Extindere rețea canalizare	12,34	4,50
Conducte de refulare	2,50	1,16
SPAU	18	0
POIANA LACULUI	Planificat	Realizat la 30.06.2026
Extindere aductiune	11,82	8,4
Rezervoare Inmagazinare noi	2	0
Clorinare	1	0
SPAP	1	0

Stadiul realizării Indicatorilor rețele apă - Poiana Lacului

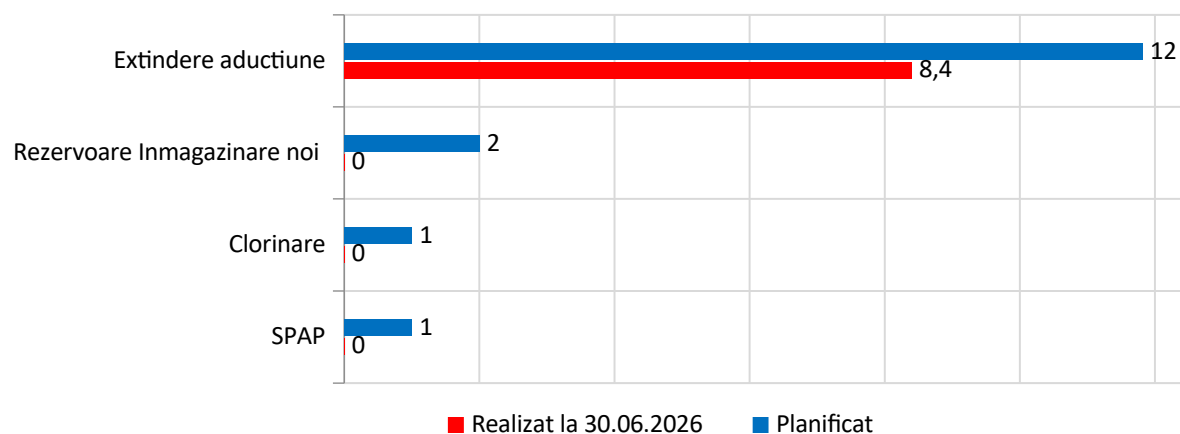



Progres contract CL6



❖ CL7 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ștefănești

ȘTEFĂNEȘTI	Planificat	Realizat la 30.06.2026
Extindere rețele distribuție	21,64	2,96
Reabilitare rețele distribuție	3,85	1,21
SPAP	3,00	0,00
Extindere rețea canalizare	26,08	3,56

Reabilitare rețea de canalizare	3,93	1,50
Conducte de refulare	11,26	1,83
Reabilitare conducte de refulare	0,99	0,20
Reabilitare SPAU	4,00	0,00
SPAU	35,00	0,00

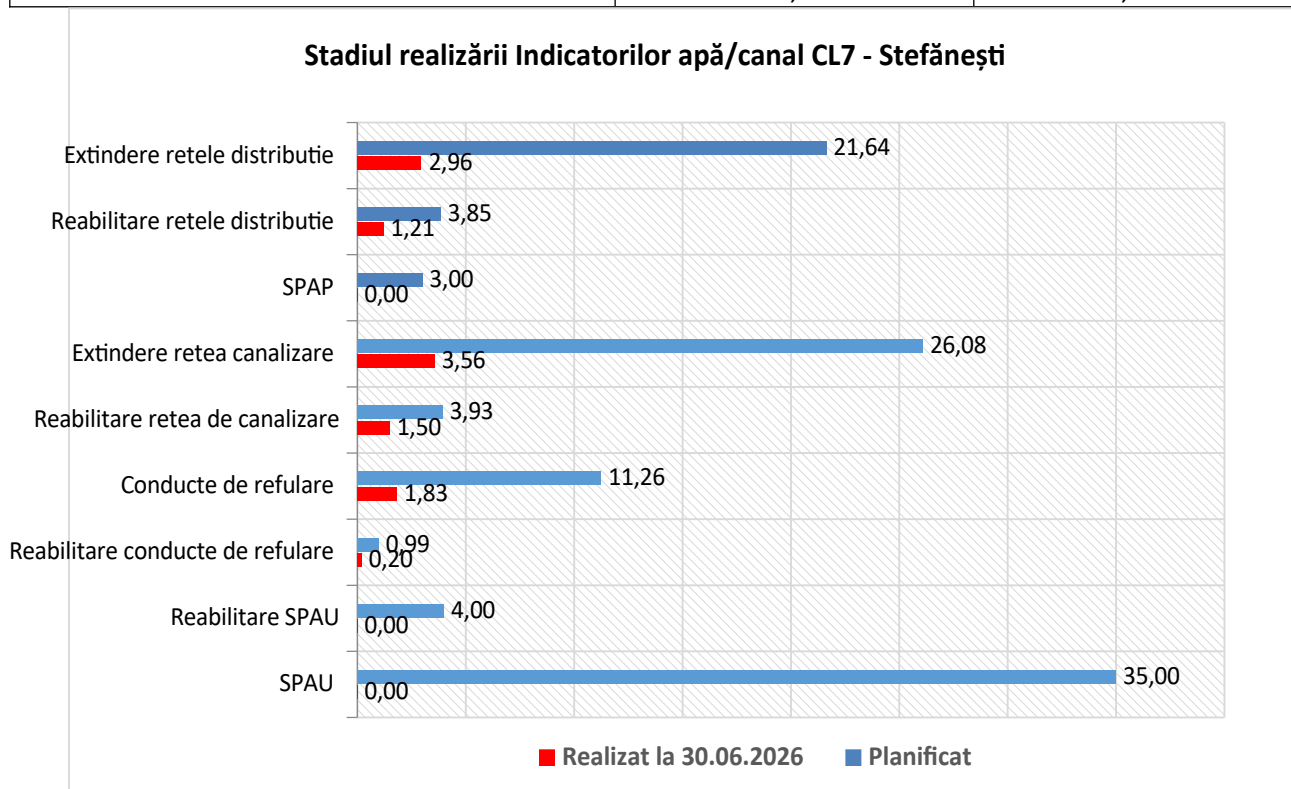


❖ CL8 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Topoloveni, Bradu, Căteasca și Albota

TOPOLOVENI	Planificat	Realizat la 30.06.2026
Extindere rețele distributiv	8,26	7,52
Reabilitare rețele distributiv	1,20	1,20
Clorinare	1	0,00
Extindere rețea canalizare	7,31	6,29


Conducte de refulare	2,04	1,54
SPAU	6	0

Stadiul realizării Indicatorilor apă/canal - Topoloveni

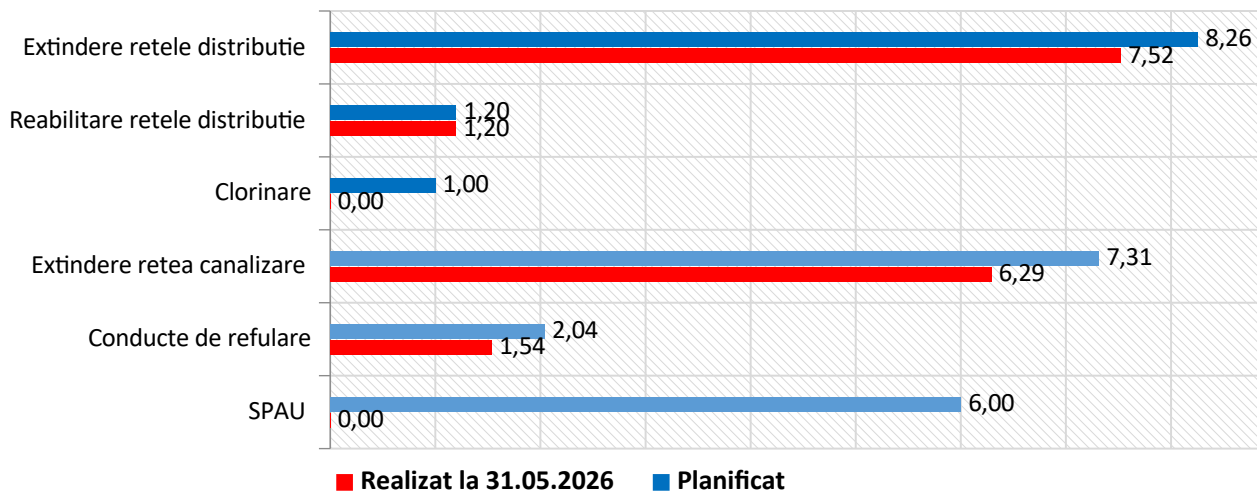


BRADU	Planificat	Realizat la 30.06.2026
Reabilitare Aducțiune	1,94	1,71
Reabilitare rețea canalizare	9,07	2,17
Conducte de refulare	0,50	0,50
SPAU	1	0

Stadiul realizării indicatorilor apă canal Bradu

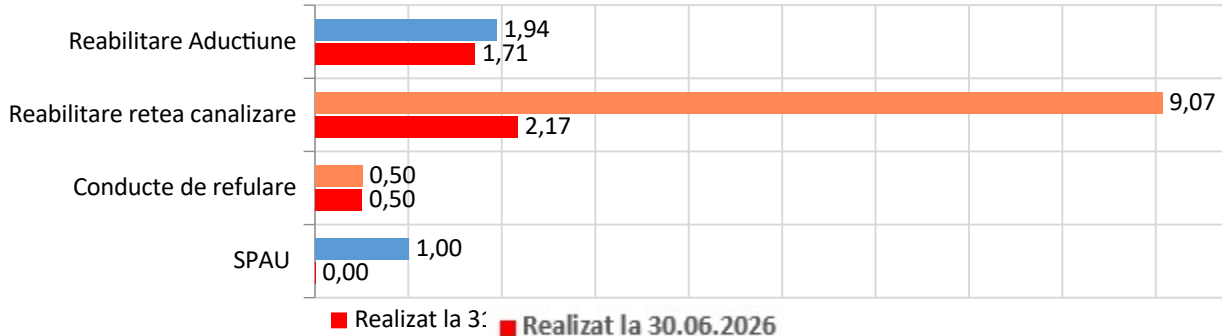

Stadiul realizării Indicatorilor rețele canalizare - Albota

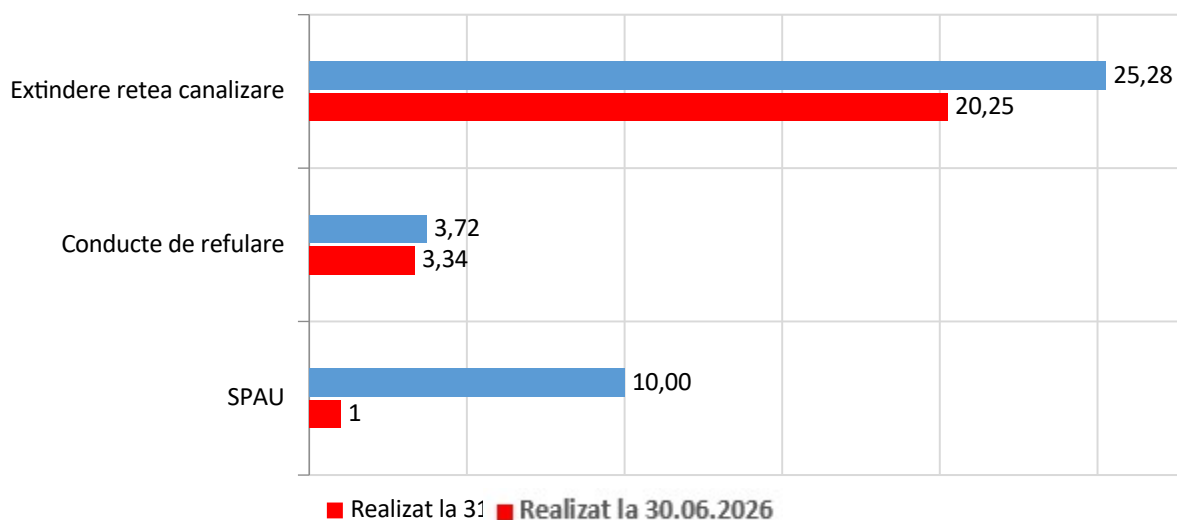


Progres contract CL8




❖ CL9 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Costești și comuna Buzoești

COSTESTI	Planificat	Realizat la 30.06.2026
Extindere aductiune	5,09	3,79
Extindere rețele distribuție	2,32	3,44
Reabilitare rețele distribuție	1,78	1,81


Reabilitare SPAP	1	0
SPAP	2	0
Extindere retea canalizare	40,31	40,00
Conducte de refulare	4,24	3,49
SPAU	19	2

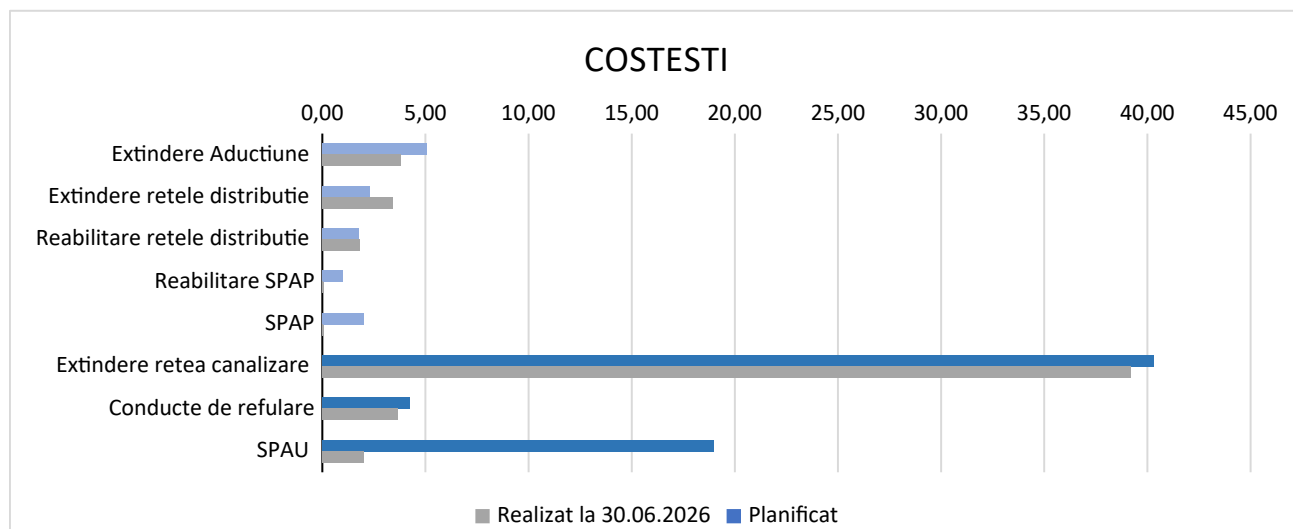

BUZOESTI	Planificat	Realizat la 31.06.2026
Extindere Aductiune	15,03	14,55
Extindere retea canalizare	25,91	13,04
Conducte de refulare	9,85	8,01
SPAU	15	0





Stadiul realizării indicatorilor apă/canal- Buzoești

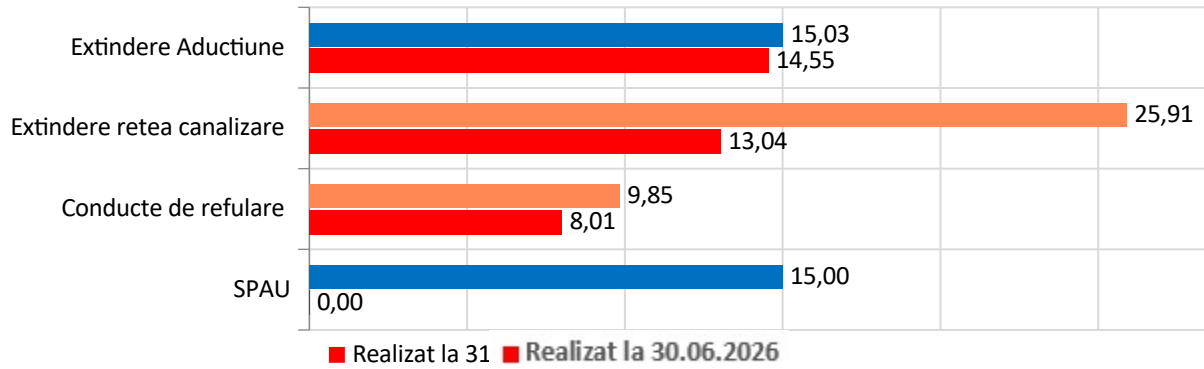

❖ **CL10 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Poiana Lacului**

POIANA LACULUI	Planificat	Realizat la 30.06.2026
Reabilitare rețele de distribuție	12,99	4,64
Reabilitare Rezervoare Inmagazinare	1,00	0,00
Extindere rețea canalizare	54,86	6,66
Conducte de refulare noi	21,18	3,09
SPAU	25	0

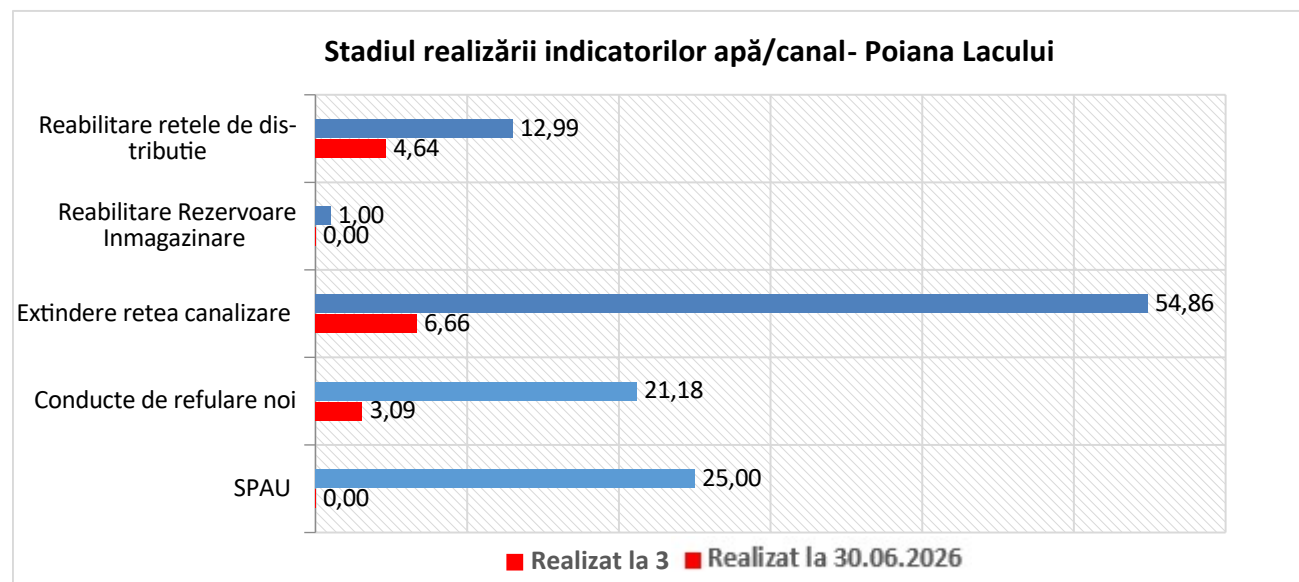

❖ **CL11 Extinderea sistemelor de alimentare cu apăși canalizare în comuna Stolnici**

STOLNICI	Planificat	Realizat la 30.06.2026
Extindere Aductiune	4,74	2,26
Extindere retele distributie	3,31	2,70
Reabilitare Aductiune	1,16	1,14
Reabilitare SPAP	1	0
Extindere retea de canalizare	40,18	38,11
Conducte de refulare	4,77	4,35
SPAU	11	0

