

Stadiul implementării contractelor



CL4A ”Reabilitare aducțiuni apă tratată, rezervoare de înmagazinare și colector principal apă uzată (Tronson Celly-SEAU Pitești) în municipio Pitești”

Contract de tip proiectare și execuție, ordinul de începere al execuției activităților de proiectare și execuție a fost emis cu data de 15.09.2025. În cadrul contractului au fost realizate următoarele:

- au fost elaborate documentațiile tehnice pentru obținerea certificatelor de urbanism, avizelor și acordurilor cerute prin acestea și a solicitat emiterea Autorizației de construire.
- au fost obținute Certificatul de urbanism nr. 921 din 31.10.2025 pentru Obiect 1 Rezervoare înmagazinare apă; Certificatul de urbanism nr. 922 din 31.10.2025 pentru Obiect 2 Colector principal apă uzată; Autorizația de Construire nr. 76/31.03.2026 pentru Obiect 1 - Rezervoare înmagazinare apă.
- au fost depuse spre aprobare documentațiile tehnice pentru următoarele obiective: DTOE Ob.1 - rezervoare de înmagazinare apă; PT + DE rezervor ZIN - versiune 1; PT+DE rezervoare Schitului 1, 2 - versiune 1; PT+DE - reparații structuri beton rezervoare și camere de vane - Obiect 1 - Reabilitare rezervoare înmagazinare apă; PT+DE reabilitare rezervoare Smeura 1, 2; PT+DE reabilitare rezervoare Războieni 1,2,3,4. Documentațiile sunt în analiză la Supvizor.



CL5.2A Reabilitarea și extinderea rețelilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești – zona Centru

Pitești Centru	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Reabilitare rețele distribuție	12,49	2,841
Reabilitare rețele canalizare	5,72	0,834

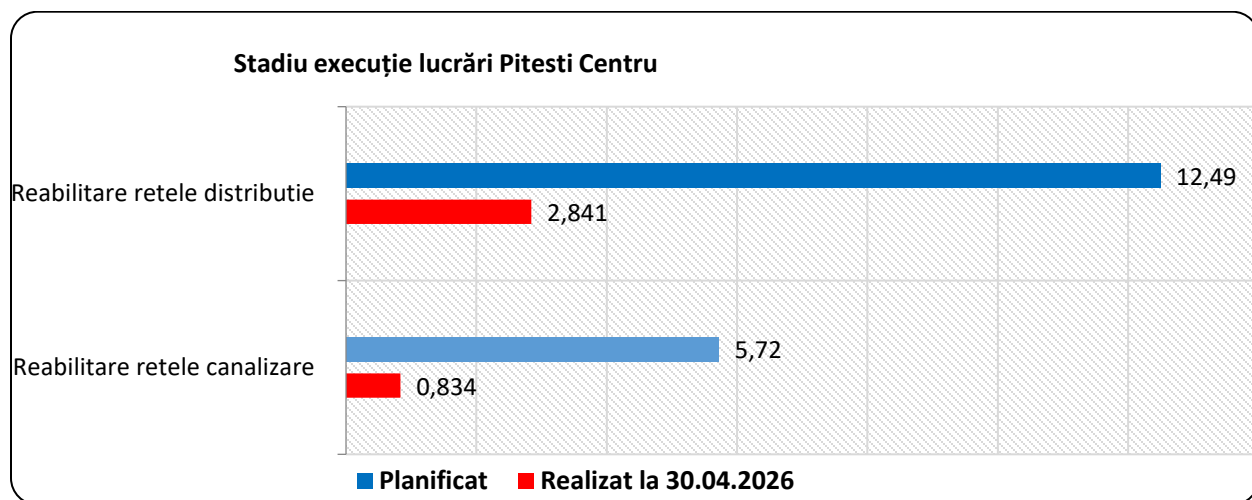

CL5.3 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești – zona Sud


Pitești SUD	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Extindere rețele distributie	1,24	1,24
Reabilitare rețele distributie	0,98	0,98
Reabilitare rețele canalizare	4,41	4,41
Extindere rețea de canalizare Pitești	1,37	1,37
SPAU noi în Pitești-zona Sud	1,00	1,00
Conducte de refulare în Pitești	0,15	0,15

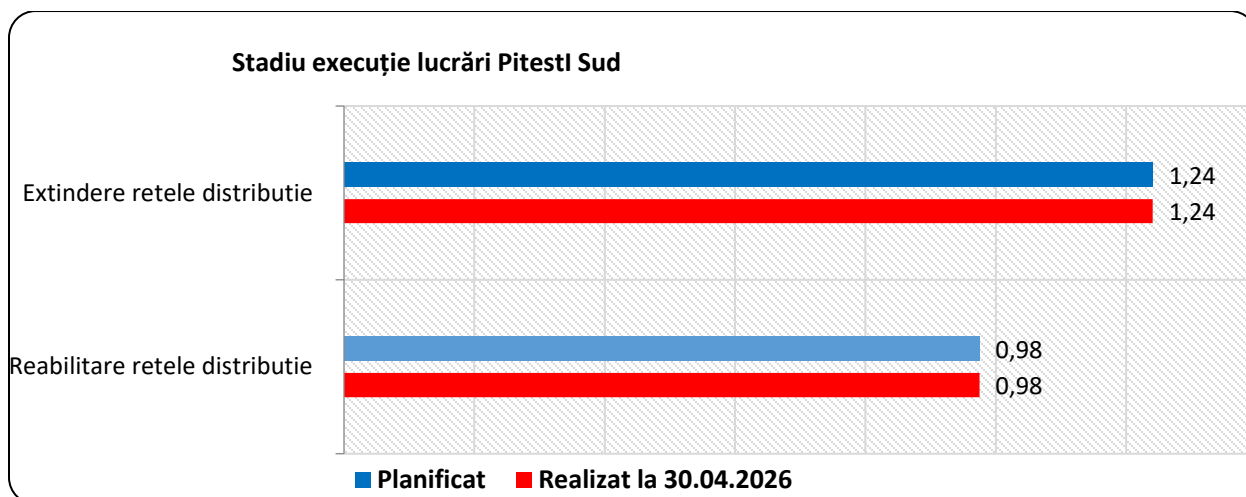

CL6 Aducțiune Pitești – Moșoaia - Poiana Lacului; Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comunele Bascov și Moșoaia


MOSOAIA	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Extindere rețele distributie	5,17	1,76
Extindere aducțiune	2,27	1,10
Rezervoare Inmagazinare noi	2,00	0,00
Clorinare	1,00	0,00
SPAP	1	0
Extindere rețea canalizare	4,34	1,34
Conducte de refulare	1,65	0,82
SPAU	6	0

Stadiul realizarii Indicatorilor apa/canal - Moșoaia

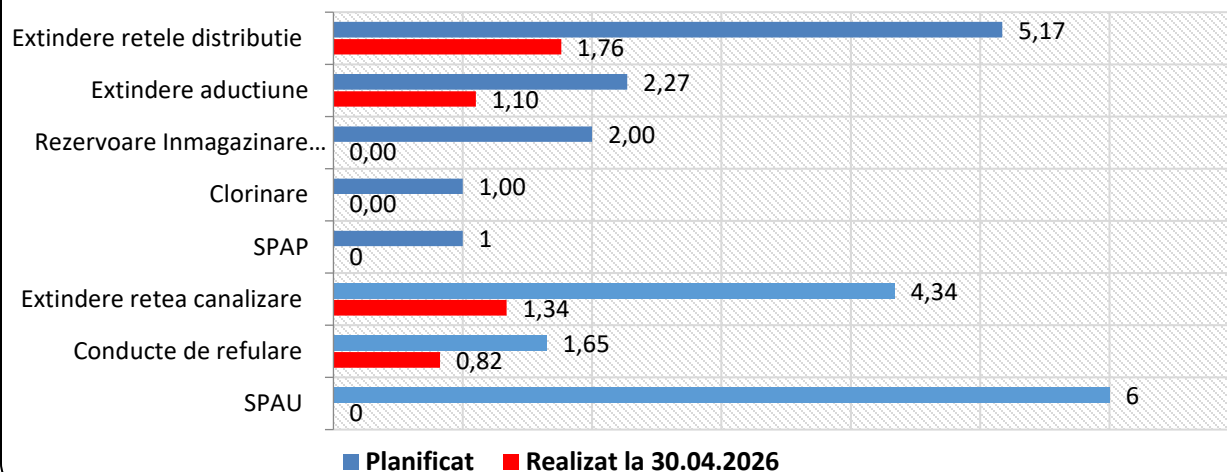


BASCOV	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Extindere rețele distributie	4,94	1,57
Reabilitare rețele distributie	3,16	0,00
SPAP	1	0
Extindere rețea canalizare	12,34	2,76
Conducte de refulare	2,50	0,63
SPAU	18	0

Stadiu realizarii Indicatorilor rețele apa/canal - Bascov

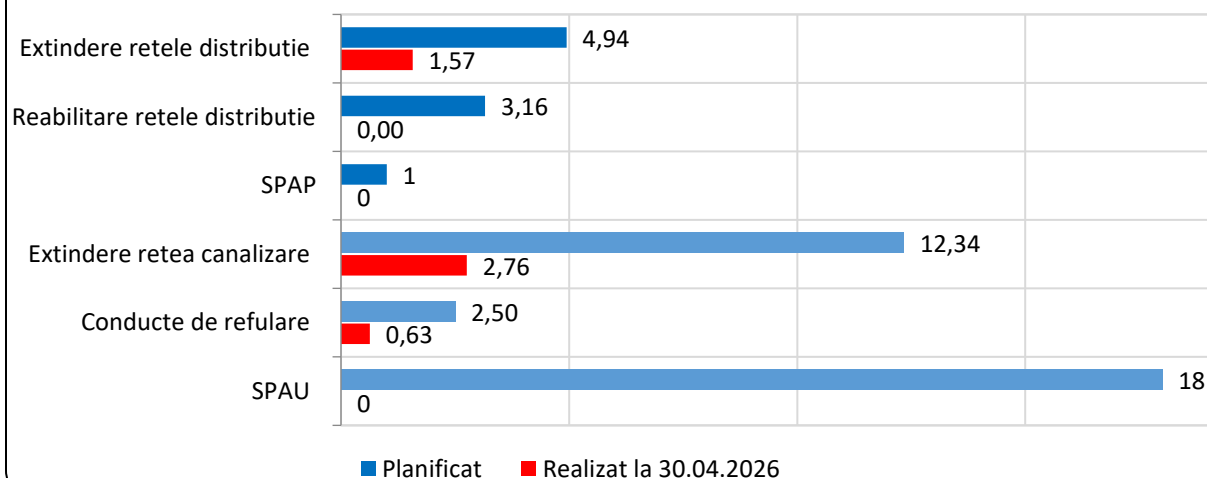

POIANA LACULUI	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Extindere aductiune	11,82	6,3
Rezervoare Inmagazinare noi	2	0
Clorinare	1	0
SPAP	1	0

Stadiu realizarii Indicatorilor retele apa - Poiana Lacului

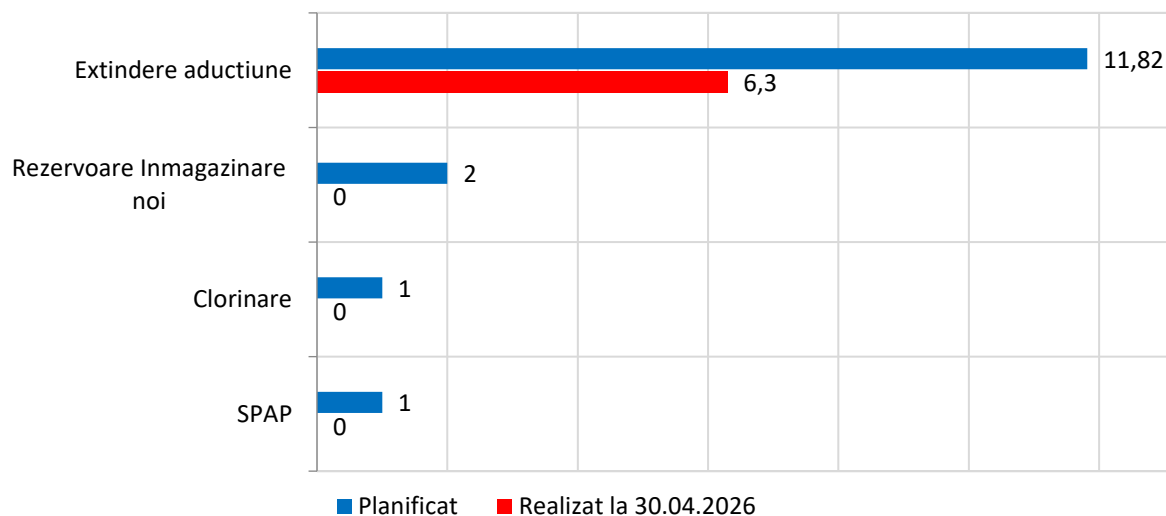


Progres contract CL6



CL7 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ștefănești

STEFANESTI	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Extindere retele distributie	21,64	1,75
Reabilitare retele distributie	3,85	1,01
SPAP	3,00	0,00
Extindere retea canalizare	26,08	2,94
Reabilitare retea de canalizare	3,93	1,50
Conducte de refulare	11,26	1,03
Reabilitare conducte de refulare	0,99	0,20
Reabilitare SPAU	4,00	0,00
SPAU	35,00	0,00

Stadiu realizarii Indicatorilor apa/canal - Stefanesti

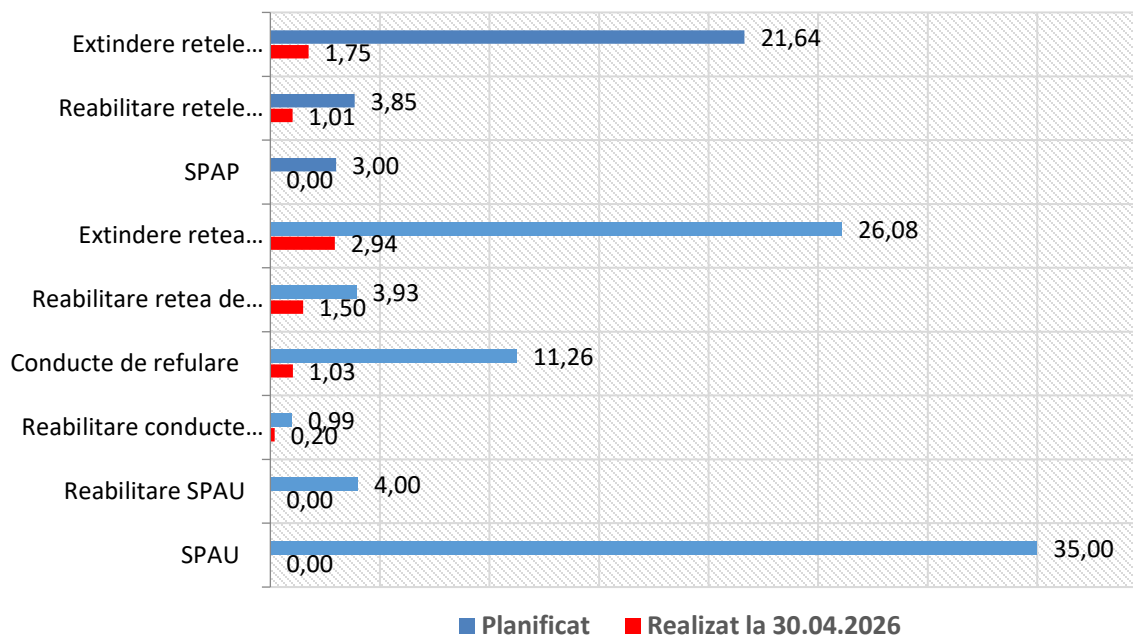


Progres contract CL7



CL8 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare în Topoloveni, Bradu, Căteasca și Albota


TOPOLOVENI	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Extindere retele distributie	8,26	6,97
Reabilitare retele distributie	1,20	1,20
Clorinare	1	0,00
Extindere retea canalizare	7,31	5,65
Conducte de refulare	2,04	1,54
SPAU	6	0

Stadiul realizarii Indicatorilor apa/canal - TOPOLOVENI

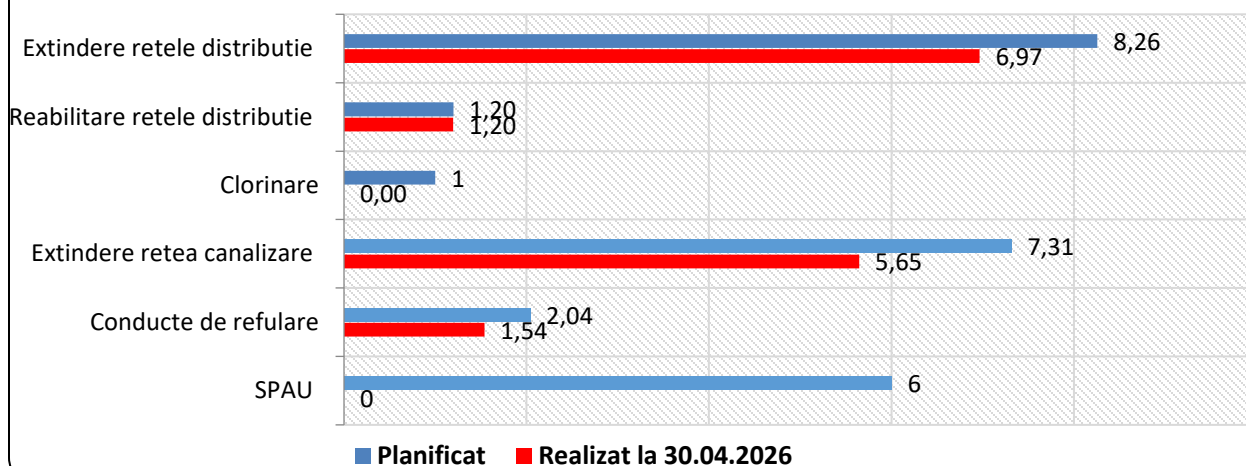


BRADU	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Reabilitare Aductiune	1,94	1,71
Reabilitare retea canalizare	9,07	2,17
Conducte de refulare	0,50	0,50
SPAU	1	0

Stadiu realizarii Indicatorilor retele apa/canalizare - BRADU

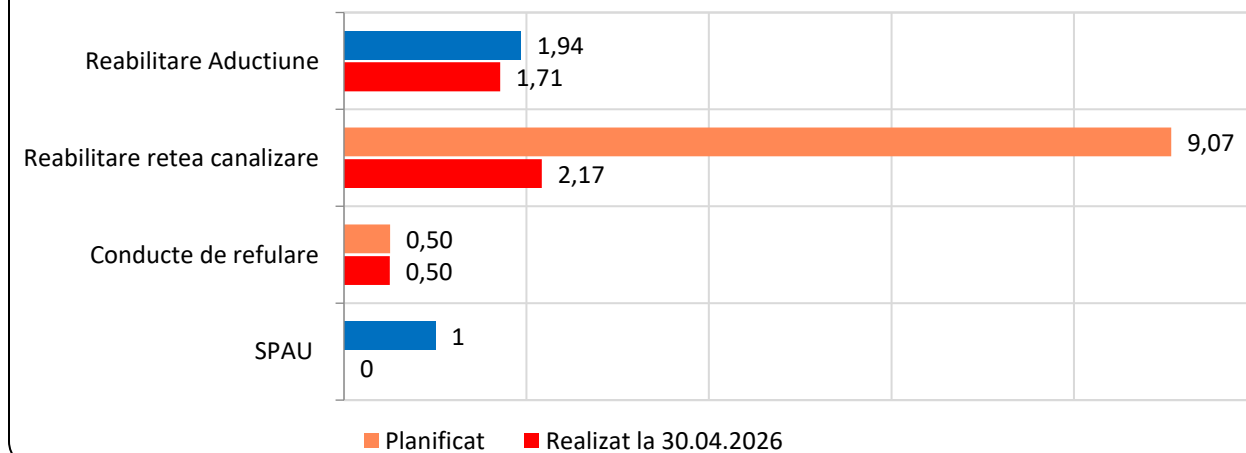

ALBOTA	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Extindere retea canalizare	25,28	19,46
Conducte de refulare	3,72	3,34
SPAU	10	0

Stadiu realizarii Indicatorilor retele canalizare - ALBOTA

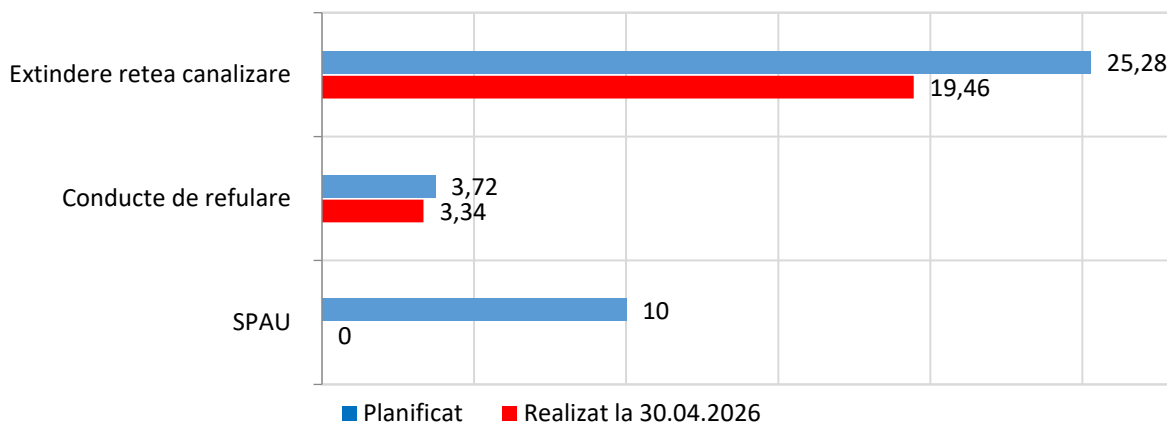


Progres contract CL8



CL9 Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Costești și comuna Buzoești


COSTESTI	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Extindere Aductiune	5,09	3,79
Extindere retele distributie	2,32	3,44
Reabilitare retele distributie	1,78	1,81
Reabilitare SPAP	1	0
SPAP	2	0
Extindere retea canalizare	40,31	40,00
Conducte de refulare	4,24	3,49
SPAU	19	2

Stadiul realizarii Indicatorilor apa/canal - Costesti

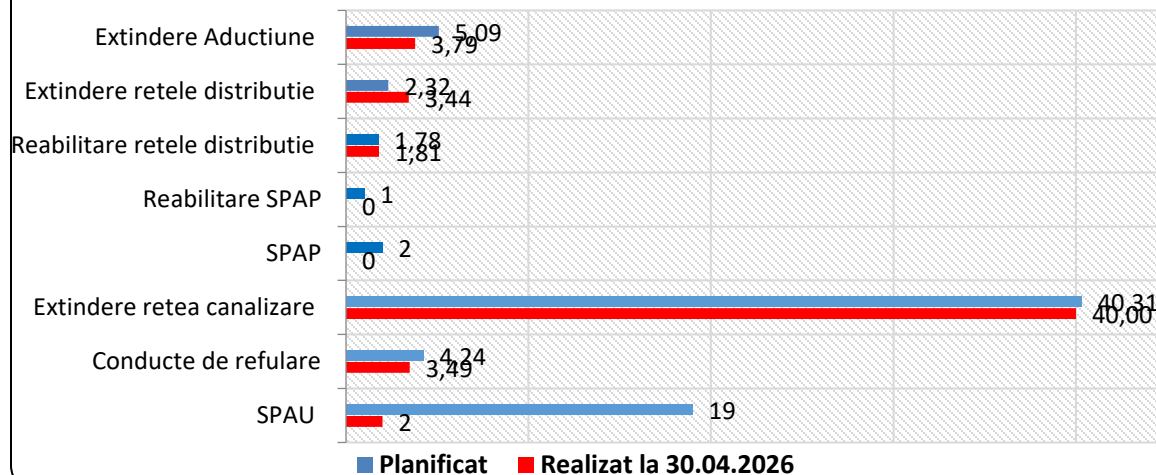

BUZOESTI	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Extindere Aductiune	15,03	14,55
Extindere retea canalizare	25,91	11,50
Conducte de refulare	9,85	8,01
SPAU	15	0

Stadiu realizarii Indicatorilor retele apa/canalizare - BUZOESTI

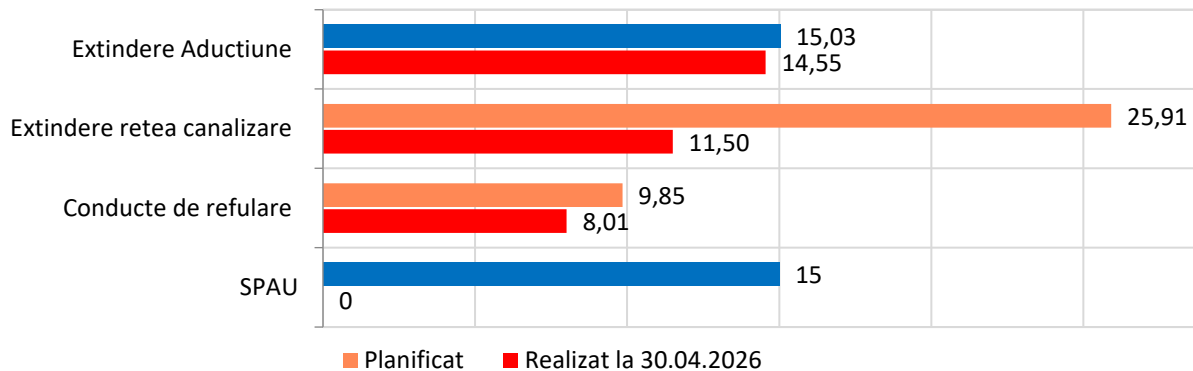


Progres contract CL9



CL10 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Poiana Lacului

POIANA LACULUI	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Reabilitare retele de distributie	12,99	4,58
Reabilitare Rezervoare Inmagazinare	1,00	0,00
Extindere retea canalizare	54,86	5,80
Conducte de refulare noi	21,18	3,09
SPAU	25	0

Stadiu realizarii Indicatorilor apa/canal - POIANA LACULUI

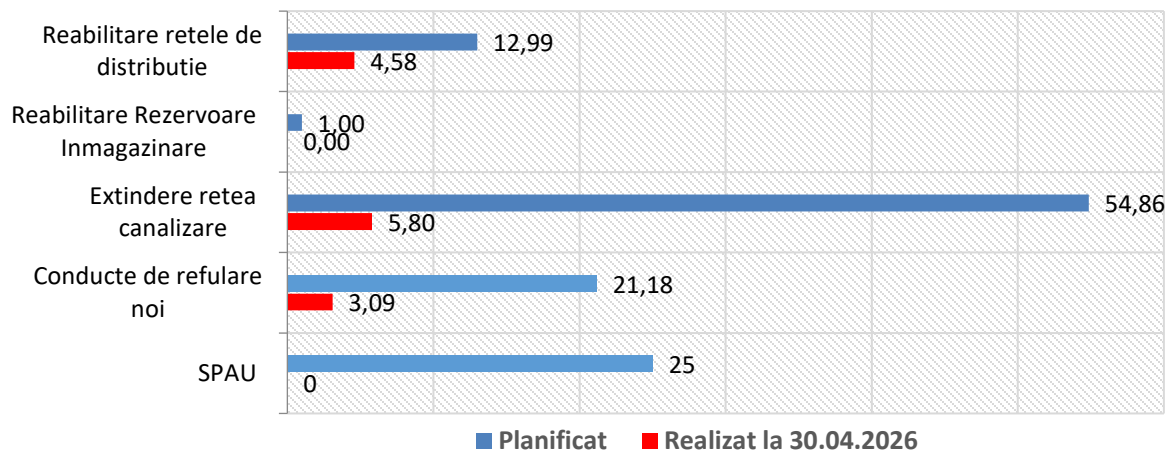


Progres contract CL10



CL11 Extinderea sistemelor de alimentare cu apăși canalizare în comuna Stolnici

STOLNICI	Planificat	Realizat la 30.04.2026
Extindere Aductiune	4,74	2,19
Extindere retele distributie	3,31	2,70
Reabilitare Aductiune	1,16	1,10
Reabilitare SPAP	1	0
Extindere retea de canalizare	40,18	37,85
Conducte de refulare	4,77	4,26
SPAU	11	0

Stadiu realizarii Indicatorilor apa/canal - STOLNICI

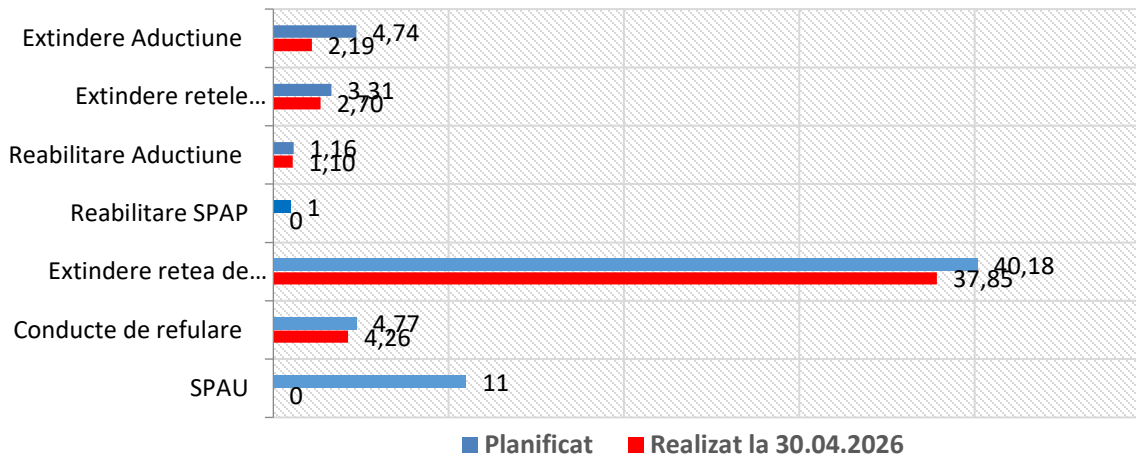

Progres contract CL11

