



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



STADIUL CONTRACTELOR DE LUCRĂRI



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CL4A Reabilitare aducțiuni apă tratată, rezervoare de înmagazinare și colector principal apă uzată (Tronson Celly-SEAU Pitești) în municipiul Pitești

- **Ordinul de începere al lucrărilor: 15.09.2025**
- **Antreprenorul lucrării: Ness Proiect Europe SRL**
- **Durata de execuție a contractului: 31 de luni**



**Reabilitare rezervoare de
înmagazinare a apei
– 9 unități**

OBIECTIVELE CONTRACTULUI

GA Războieni I – 2 x 5000 mc;
GA Războieni II – 2 x 5000 mc;
GA Schitului – 2 x 5000 mc;
GA ZIN – 1 x 5.000 mc;
GA Smeura – 2 x 5000 mc.

**Reabilitare colector principal
apa uzată tronson
Celly – SEAU Pitești**

- realizarea unui deversor de ape mari (provizoriu);
- conductă cu o lungime de 115 m, care va descarcă apele mari din timpul ploilor în pâraul Geamăna (conectarea la pâraul Geamăna).



Progres fizic: în data de 15.09.2025 a avut loc predarea amplasamentului;

- Au fost obținute certificatele de urbanism actualizate și a început elaborarea proiectului tehnic – în termen de 6 luni de la Ordinul de începere – 15.03.2026



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CL5.2A Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești – zona CENTRU

- **Ordinul de începere al lucrărilor: 20.10.2025**
- **Antreprenorul lucrării: Kranz Eurocenter S.R.L.- Habau S.R.L.**
- **Durata de execuție a contractului: 36 de luni**

OBIECTIVELE CONTRACTULUI

❖ **Reabilitare (înlocuire) conducte de distribuție a apei potabile:**

Bulevardul Petrochimistilor, Bulevardul Frații Golești, Gheorghe Doja, Constructorilor, Vasile Pârvan, Calea Craiovei, Independenței, Dobrescu C. Argeș, Intrarea Nicolae Dobrin, Narciselor, Tudor Arghezi, Calea Drăgășani, Aleea Virgil Tempeanu, I. Ionescu de la Brad, Iosif Gabrea, Câmpului, Eugen Lovinescu, Vasile Alecsandri, Aleea Poienița, Stadionului (Nicolae Dobrin), Armand Călinescu, Smeurei, Oituz, Trivale.

12.485 m



❖ **Reabilitare (înlocuire) conducte de canalizare:**

Constructorilor ((bl. A, bl. D, Craiovei), Vasile Pârvan (bl. H5 - J8, Războieni, bl. A5 - vărsare Războieni), Calea Craiovei (+bl. 3 – 8, Craiovei), Câmpului (+ adiacente Pinilor și fundătura Câmpului), Aleea Poieniței (bl. 69-72A, bl. P9, Trivale), Alexandru Vălescu (bl. J14 – J15, Craiovei), Oituz (bl. C9 - vărsare), Tineretului, Cuza Vodă, Smârdan, Mihai Eminescu, Traian Vuia, Pictor Nicolae Grigorescu (+ adiacent blocuri 24-21, 19-16)

5.725 m

➤ **Progres fizic:**

- în data de 12.11.2025 a fost predat amplasamentul general al lucrărilor;
- a fost începută execuția lucrările pe străzile: Traian Vuia, Nicolae Dobrin și Frații Golești – Mun. Pitești



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CL5.3 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești – zona SUD

- Ordinul de începere al lucrărilor: 14.12.2022
- Antreprenorul lucrării: KRANZ EUROCENTER SRL – CONARG AG SRL
- Durata de execuție a contractului: 18 luni

CONTRACT FINALIZAT

PVRTL nr. 1 din data de 07.08.2024.

Lucrări realizate:


- extinderea rețelei de alimentare cu apă - 1 km;
- extinderea rețelei de canalizare - 1,1 km;
- realizarea unei stații de pompare ape uzate;
- reabilitarea rețelei de alimentare cu apă - 1 km;
- reabilitarea rețelei de canalizare - 4,4 km.
- Branșamente noi: 69
- Racorduri noi: 69



Str. Targușin Vale



Str. Mihai Eminescu

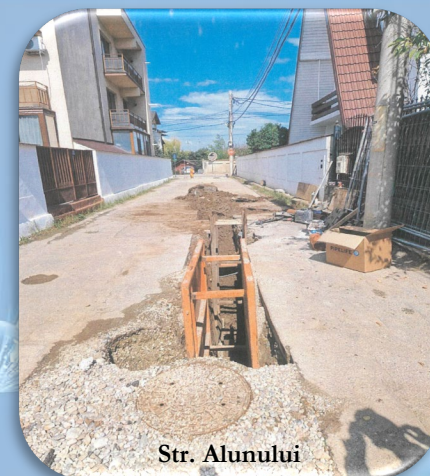

Str. Alunului



Blv. Petrochimistilor





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CL6 Aducțiune Pitești - Moșoaia - Poiana Lacului; Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comunele Bascov și Moșoaia

- **Ordinul de începere al lucrărilor: 25.02.2025**
- **Antreprenorul lucrării: Bugaru Trans SRL**
- **Durata de execuție a contractului: 12 de luni**

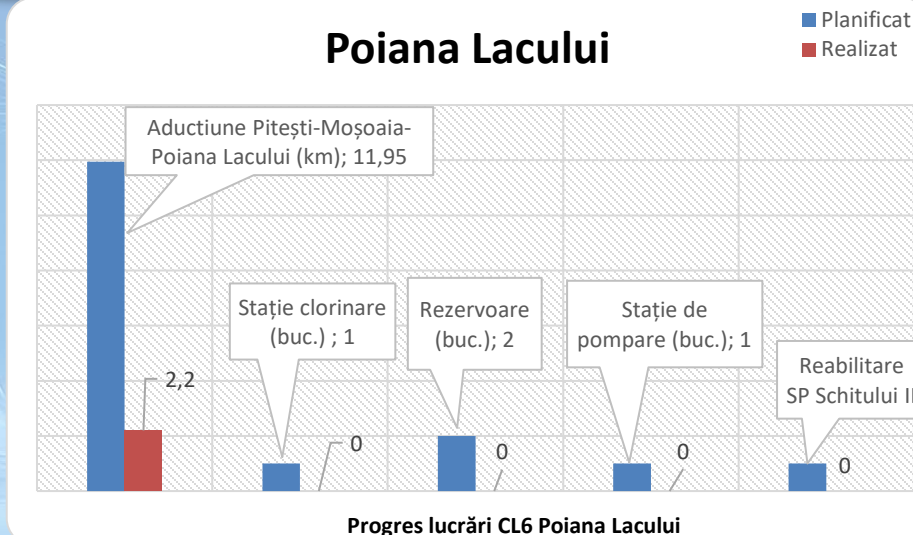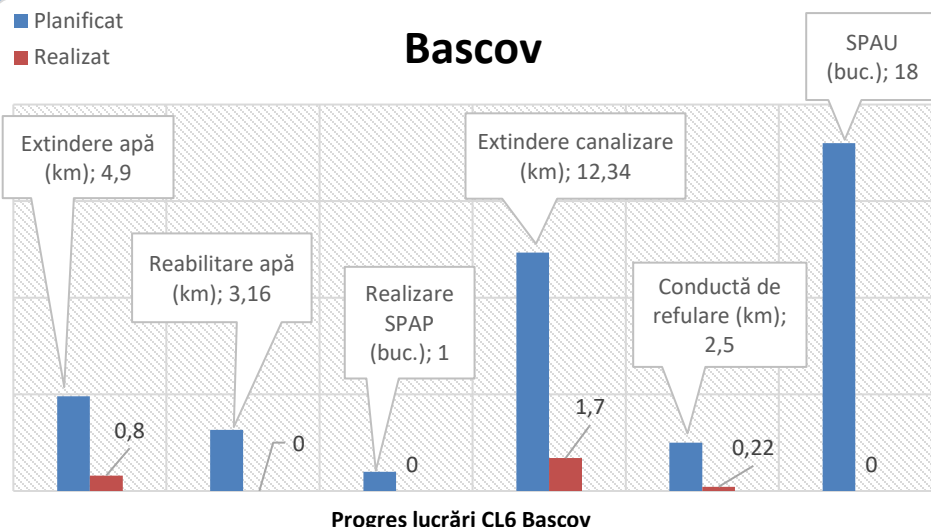

Progres fizic contract CL6: 14%

Sunt în execuție lucrările: aducțiune Pitești - Moșoaia - Poiana Lacului pe tronsonul Gospodăria de apă Schitului - Gospodăria de apă Moșoaia și pe 5 străzi din loc. Bascov (Stejăret, Armatei, Frasinului, Brândușelor, Fermei).




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CL6 Aducțiune Pitești - Moșoaia - Poiana Lacului; Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comunele Bascov și Moșoaia

Moșoaia


■ Planificat
■ Realizat

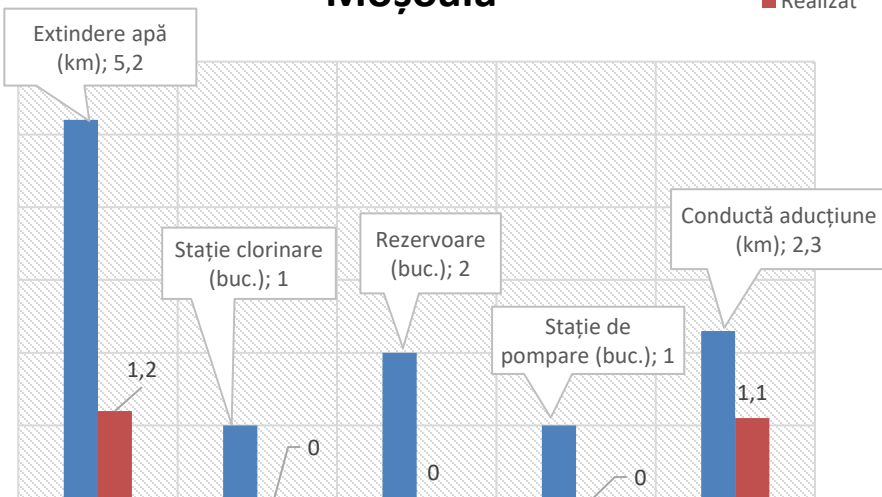

Progres lucrări alimentare cu apă CL6

Moșoaia

■ Planificat
■ Realizat

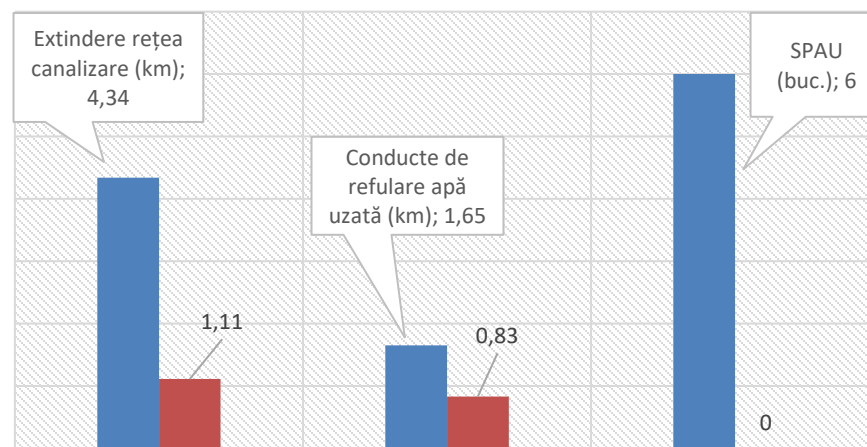

Progres lucrări canalizare CL6

Progres fizic: Sunt în execuție lucrări pe 5 străzi în Moșoaia (Drumul Morii, Platoul Stejarilor, Drumul Sării, Aleea Nucului, Aleea Teilor).



Cofinanțat de
Uniunea Europeană




CL7 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ștefănești

- Ordinul de începere al lucrărilor: 21.02.2025
- Antreprenorul lucrării: Ro Construct Center SRL - Rocip Instal SRL - Cukurova Construction Company Inc.
- Durata de execuție a contractului: 14 de luni



Ștefănești


■ Planificat
■ Realizat

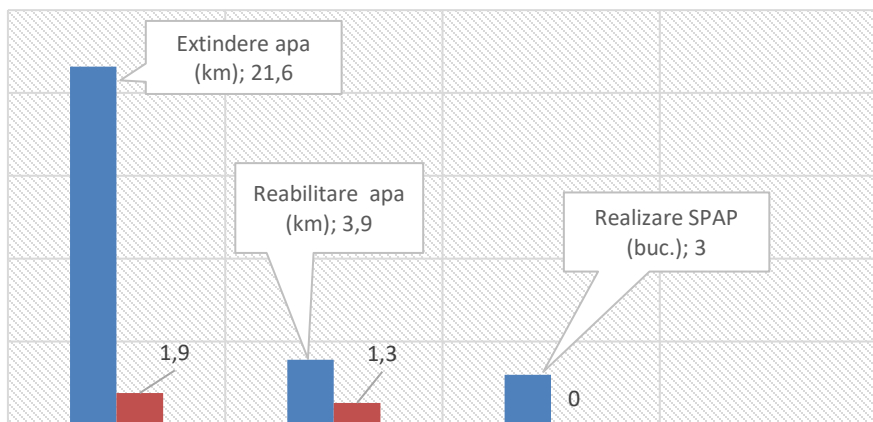

Progres lucrări alimentare cu apă CL7

Ștefănești

■ Planificat
■ Realizat

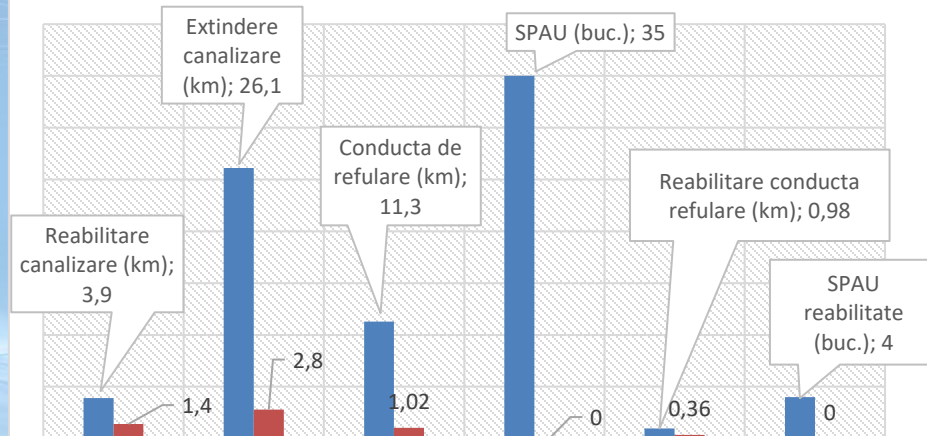

Progres lucrări canalizare CL7

Progres fizic contract CL7: 17%

Sunt în execuție lucrări pe un număr de 35 de străzi în Orașul Ștefănești.





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CL8 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Topoloveni, Bradu, Căteasca și Albota



- Ordinul de începere al lucrărilor: 23.04.2024
- Antreprenorul lucrării: Hyatt Development 2011 S.R.L. – Energomontaj Grup S.R.L.
- Durata de execuție a contractului: 22 de luni

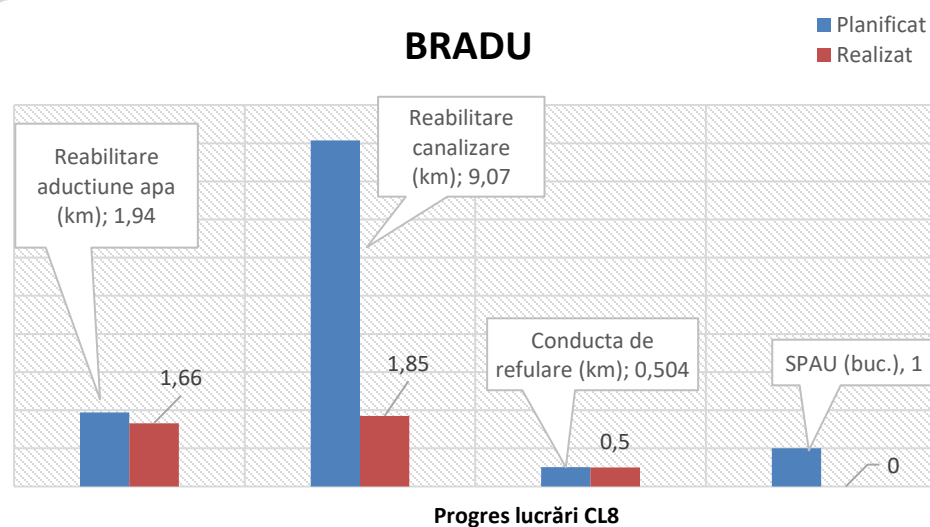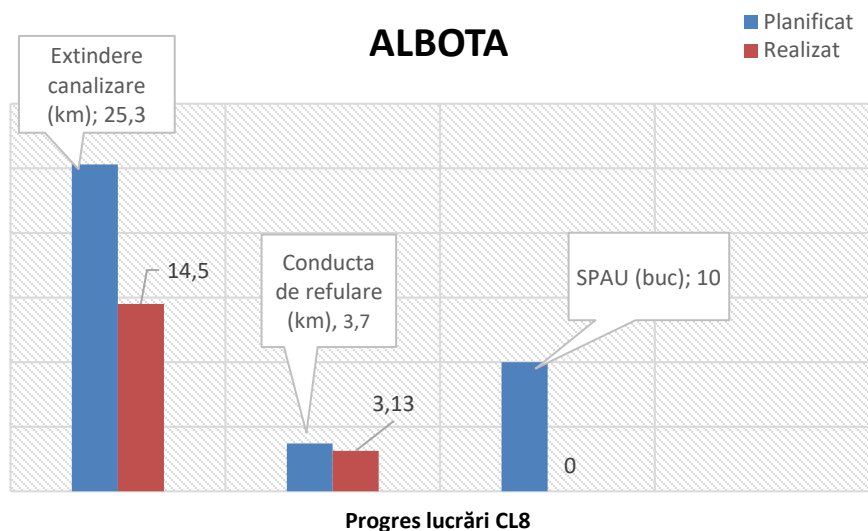

Progres fizic contract CL8: 62%

Au fost executate până în prezent:
În loc. Albota 512 racorduri canalizare noi și în loc. Bradu
au fost reabilitate 45 racorduri.






Cofinanțat de
Uniunea Europeană




CL8 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Topoloveni, Bradu, Căteasca și Albota

TOPOLOVENI

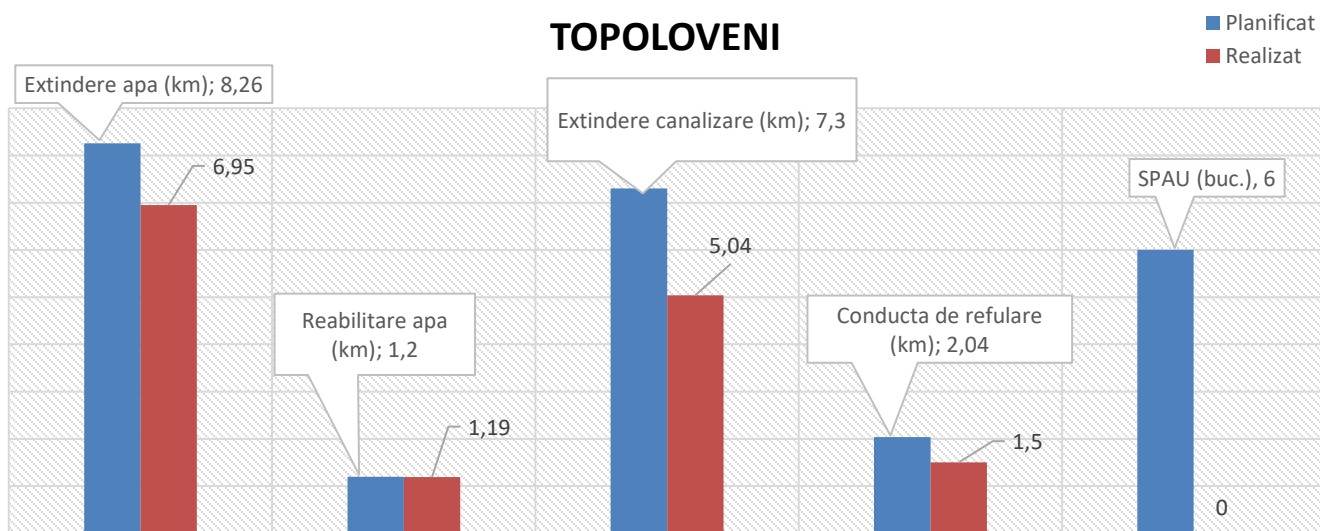

Progres lucrări CL8

CĂTEASCA

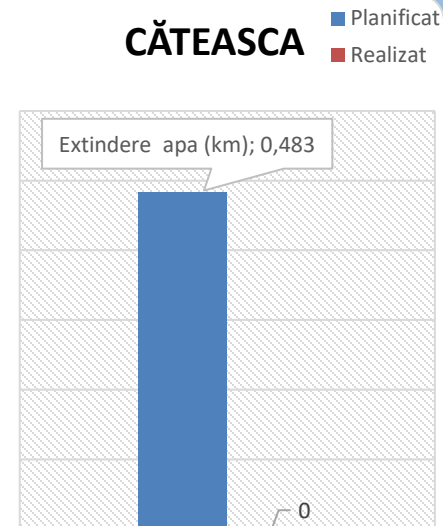

Progres lucrări CL8



În Orașul Topoloveni au fost executate până în prezent 200 de branșamente apă și 116 de racorduri canalizare noi.







Cofinanțat de
Uniunea Europeană




CL9 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Costești și comuna Buzoești

- Ordinul de începere al lucrărilor: 04.12.2023
- Antreprenorul lucrării: Hyatt Development 2011 – High Tech Clima – Energomontaj Grup – Motris Company
- Durata de execuție a contractului: 28 de luni

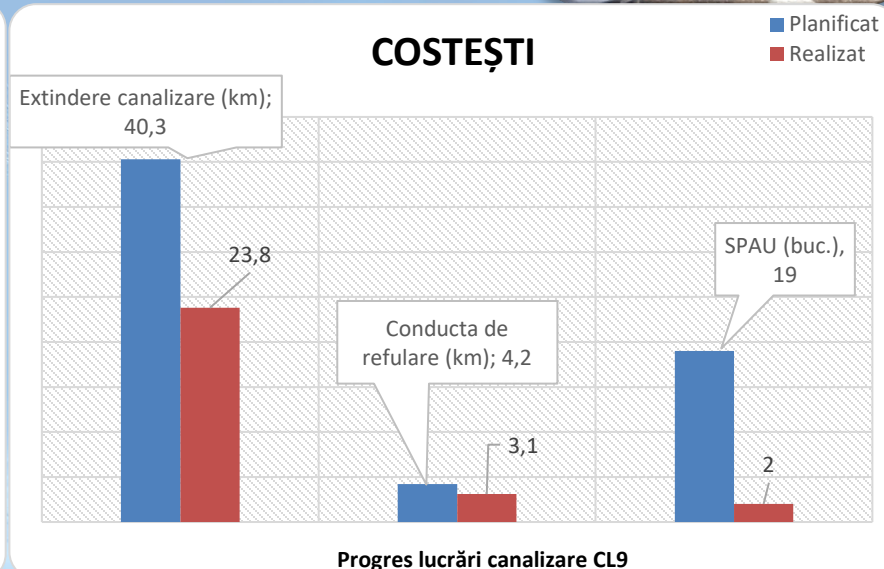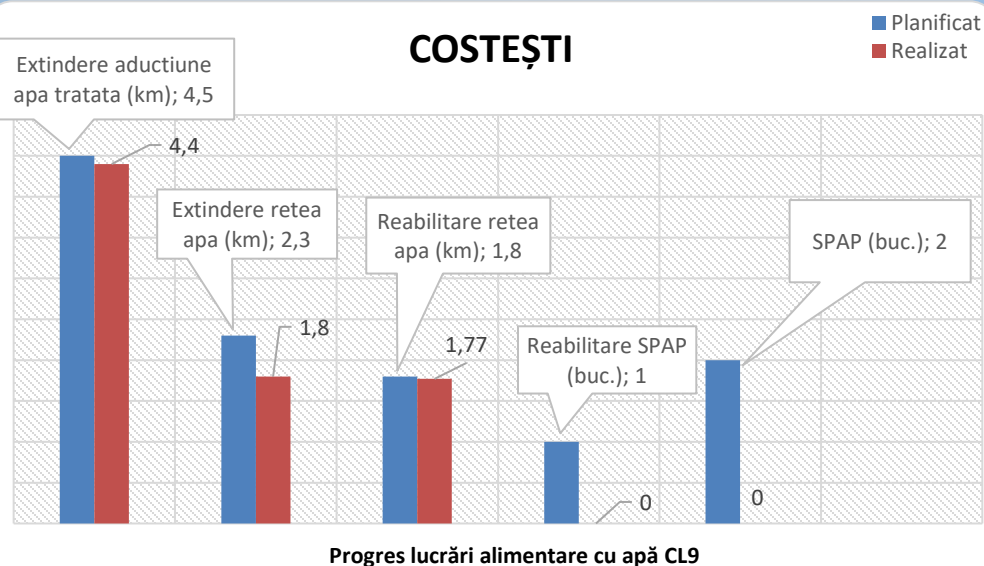

Progres fizic contract CL9: 78%

În Orașul Costești au fost executate până în prezent: 68 de branșamente apă noi, 65 de branșamente apă reabilitate și 456 de racorduri canalizare noi.






Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CL9 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Costești și comuna Buzoești

BUZOEȘTI

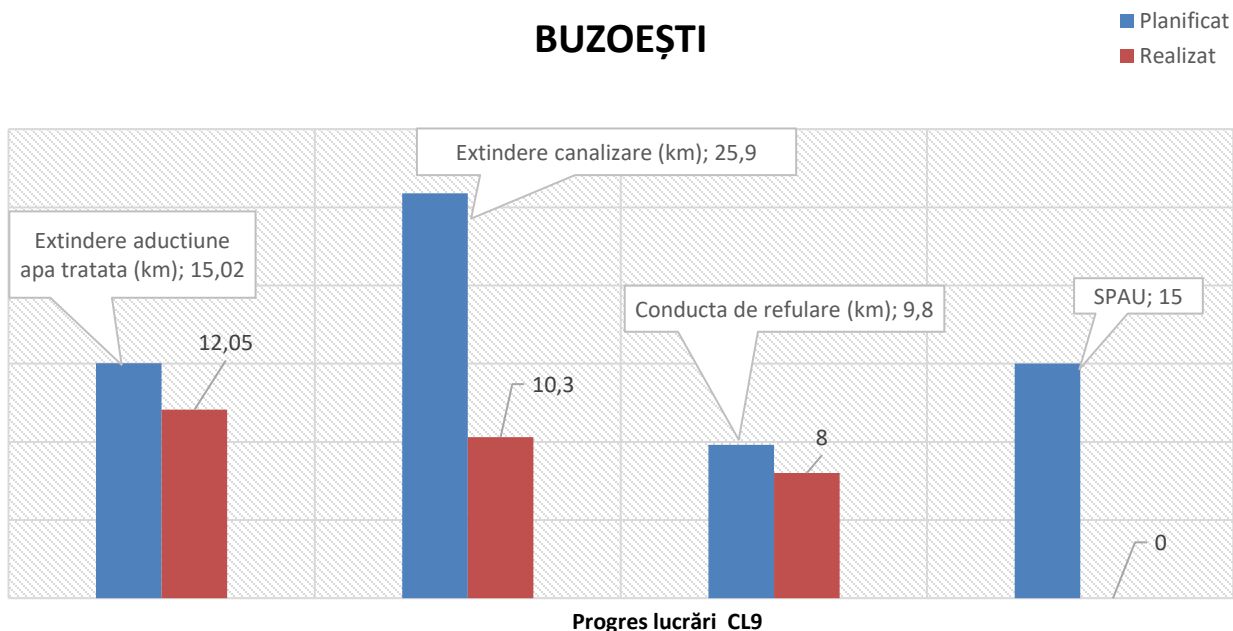

În loc. Buzoești au fost executate până în
prezent 288 de racorduri canalizare noi





Cofinanțat de
Uniunea Europeană




CL10 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Poiana Lacului

- Ordinul de începere al lucrărilor: 23.06.2025
- Antreprenorul lucrării: Energomontaj Grup S.R.L.- Hyatt Development 2011 S.R.L. – Raicommerce Construction JSC.
- Durata de execuție a contractului: 28 de luni

POIANA LACULUI


■ Planificat
■ Realizat

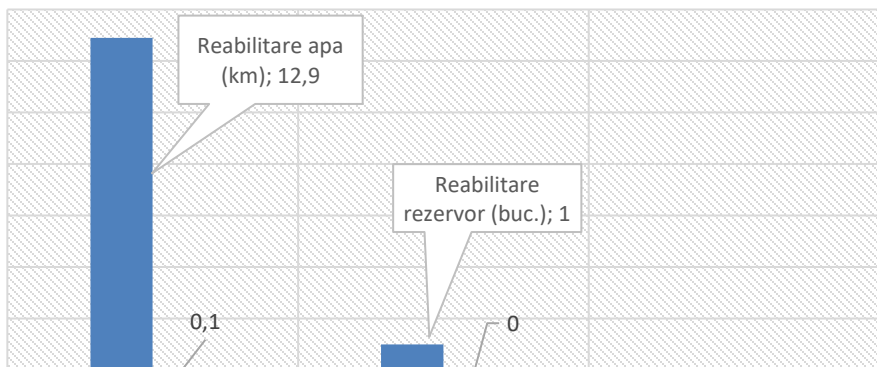

Progres lucrări alimentare cu apă CL10

POIANA LACULUI

■ Planificat
■ Realizat

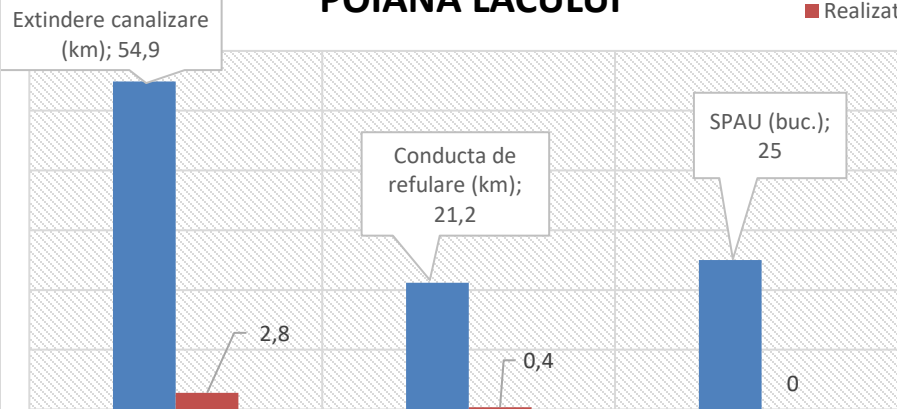

Progres lucrări canalizare CL10

Progres fizic contract CL10: 2%

În data de 01.07.2025 a avut loc predarea generală a amplasamentului lucrărilor






Cofinanțat de
Uniunea Europeană




CL11 Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Stolnici

- Ordinul de începere al lucrărilor: 27.11.2023
- Antreprenorul lucrării: Asocieria Hyatt Development 2011 – High Tech Clima
- Durata de execuție a contractului: 27 de luni

STOLNICI

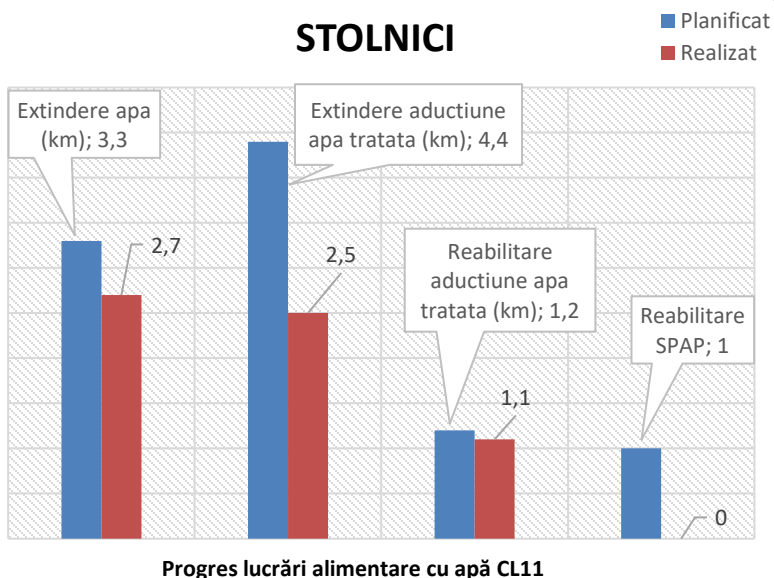

STOLNICI

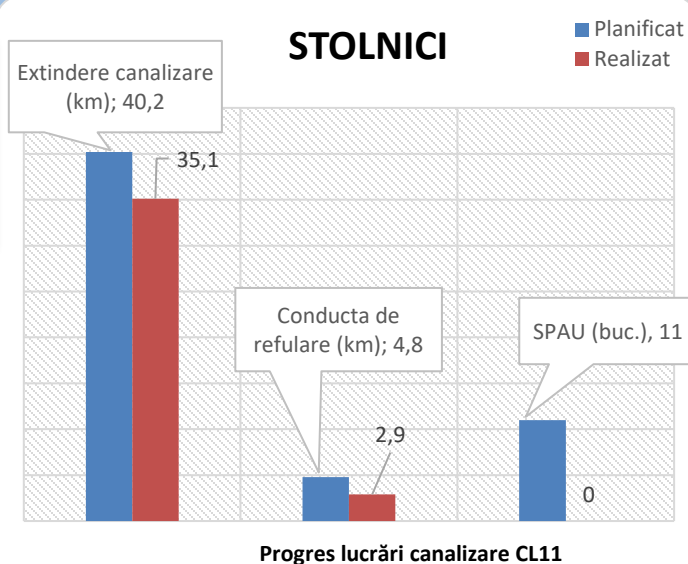

Progres fizic contract CL11: 83 %

În loc. Stolnici au fost executate până în acest moment 47 brânșamente apă și 1504 racorduri canalizare noi



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Contracte de lucrări în procedură de atribuire

- ❖ **Contractul de lucrări CL1B** „*Extinderea și modernizarea surse de apă, conducte de aducțiune apă brută, stații de tratare, stații de pompare și rezervoare în Județul Argeș*” – contract de tip Proiectare și execuție
- ❖ **Contractul de lucrări CL3** „*Extindere și modernizare stații de epurare în județul Argeș*” – contract de tip Proiectare și execuție
- ❖ **Contractul de lucrări CL5.1** „*Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești – zona Nord*” – contract de tip Antrepriză



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



STADIUL CONTRACTELOR DE SERVICII



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CS01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea contractelor de lucrări

- Ordin de începere: 26.08.2025
- Prestator Asocierea Ramboll South East Europe SRL – Ramboll Danmark A/S
- Durata contractului: 57 luni

Activitățile contractului:

▪ Activitatea A – Asistență tehnică în Managementul Proiectului:

- A.1 - Asistentă pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de finanțare
- A.2 - Actualizarea sistemului GIS și de Modelare hidraulică existente pentru sistemele de alimentare cu apă și de canalizare din aria proiectului
- A.3 - Actualizarea Strategiei de management a nămolului
- A.4 - Managementul apelor uzate industriale
- A.5 - Managementul pierderilor în rețelele de apă și apă uzată
- A.6 - Actualizarea Master Planului privind necesarul de investiții în aria de operare
- A.7 - Expertiză tehnică, modelere hidraulică și CCTV
- A.8 - Suport acordat la raportarea privind durabilitatea

**Progres
fizic: 5%**

▪ Activitatea B - Publicitatea Proiectului

▪ Activitatea C - Supervizarea contractelor de lucrări




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CS01- stadiul realizării activităților

- ☐ **Activitatea A1 - Asistență pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de finanțare: în derulare**
 - Activitatea vizează acordarea de asistență tehnică/suport managerial pentru administrarea Contractului de Finanțare nr. 160/05.06.2025 și sprijin Unității de Implementare a Proiectului;
- ☐ **Activitatea 2 - Actualizarea sistemului GIS și de Modelare hidraulică existente pentru sistemele de alimentare cu apă și de canalizare din aria proiectului: în derulare**
 - În perioada 10 – 21 noiembrie 2025 s-a desfășurat instruirea personalului Apă Canal 2000 S.A. Pitești pentru utilizarea programelor de Modelare Hidraulică (OpenFlows Water și OpenFlows Sewer);
 - Au fost achiziționate și predate Beneficiarului echipamentele software necesare activităților de GIS și Modelare Hidraulică;

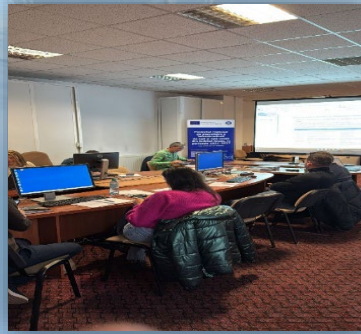



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CS01 - stadiu realizării activităților

- ☐ Activitatea A3 - Actualizarea strategiei de management a nămolului: în derulare
- ☐ Activitatea 4 - Managementul apelor uzate industrial: în derulare
- ☐ Activitatea 5 - Managementul pierderilor în rețelele de apă și apă uzată: în derulare
- ☐ Activitatea 6 - Actualizare Master Plan privind necesarul de investiții: în derulare
- ☐ Activitatea 7 - Expertiză tehnică, modelare hidraulică și CCTV: în derulare
 - În perioada 17.11. - 08.12.2025 a fost organizată campania de expertiză tehnică CCTV pe colectorul principal ce asigură transportul apelor uzate către Stația de epurare apă uzată Pitești.





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CS01 - stadiul realizării activităților

☐ Activitatea B - Publicitatea Proiectului: în derulare

Principalele măsuri de informare și publicitate realizate conform Ghid Identitate Vizuală 2021-2027: conferința de lansare, panouri permanente, comunicate de presă, materiale publicitare, campania de promovare în școli, broșura, etc.

Materiale promovare proiect



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată
din județul Argeș, în
perioada 2021-2027

Cod SMIS 2021+338635

Contract de finanțare:
nr. 160/05.06.2025
Valoarea totală a proiectului:
902.67.033,79 lei
Valoarea contribuției comunitare:
596.212.534,03 lei
Termen de finalizare:
31.08.2026

Investim
în apă,
modernizăm
pentru tine!



Beneficiar:



Pikky este
mascota societății,
marca înregistrată.

www.apacanal2000-pdd.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027

Site-ul dedicat Proiectului Regional poate fi accesat la adresa: <https://apacanal2000-pdd.ro>



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Alte contracte de servicii

☐ CS02 Auditul financiar al Proiectului

- Ordin de începere: 22.07.2022
- Prestator: Agenția de Audit Financiar AFIL S.R.L.
- Durata contractului: 90 luni

Progres fizic:
32 %

- **Obiectivul:** verificarea implementării Proiectului Regional prin examinarea de către Auditor a informațiilor factuale ce rezultă din implementarea Contractului de Finanțare.

☐ CS03 Asistență tehnică din partea proiectantului conform Legii nr. 10/1995 în faza de execuție a lucrărilor

- Ordin de începere: 11.12.2024
- Prestator: S.C. ECOAPA DESIGN
- Durata contractului: 57 luni

Progres fizic:
20 %

☐ CS 183/2016 Asistență tehnică din partea proiectantului conform Legii nr. 10/1995 în faza de execuție a lucrărilor

- Prestator: TPF INGINERIE
- Durata contractului: 15 luni

Contract
finalizat



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Contracte de furnizare

❑ CP02 - Lot1 Achiziție de echipamente detectare pierderi, inspecție CCTV și vehicule întreținere rețele de canalizare Lot 1

- Ordin de începere: 20.09.2022
- Prestator: S.C. Envirotronic S.R.L.
- Durata contractului: 12 luni

Contract
finalizat

Obiectul contractului: achiziție echipamente noi pentru detectarea pierderilor de apă și autolaborator transportor pentru echipamente și personal.



❑ CP01 - Furnizare și instalare echipament SCADA

- În pregătire pentru lansare procedură de atribuire în SEAP (trimestrul I 2026).



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

- ➔ **Progres fizic Proiect: 30%**
- ➔ **Progres financiar Proiect: 11%**
- ➔ **Progres rambursări: 9%**

DECEMBRIE 2025



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Provocări

Finalizarea tuturor investițiilor în termenele propuse la semnarea proiectului în PDD.

În acest sens:

- ✓ Respectarea graficelor de execuție, în contextul unor întârzieri generate de factori tehnici și organizatorici.
- ✓ Obținerea în termen a avizelor și autorizațiilor necesare pentru continuarea lucrărilor;
- ✓ Mobilizarea completă a antreprenorilor pe toate șantierele active și a echipei Supervizorului;
- ✓ Gestionarea ajustărilor de preț cauzate de creșterea costurilor cu materialele și forța de muncă;
- ✓ Coordonarea eficientă între toți actorii implicați – Proiectant, Antreprenor, Supervizor, autorități;
- ✓ Menținerea unei comunicări transparente cu comunitățile locale, afectate temporar de lucrări;
- ✓ Asigurarea unei monitorizări constante a progresului fizic și financiar, pentru respectarea condițiilor de finanțare;
- ✓ Asigurarea fluxului rambursărilor pentru a avea resurse financiare pentru plata antreprenorilor și consultanților.
